


الجمهورية اليمنية




رئاسة مجلس الوزراء
أمانة العاصمة صنعاء
الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة
وتطوير الطرق والأماكن العامة




التقرير العام لسنة ٢٠٢١م للفعاليات والنشاطات في الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة بأمانة العاصمة



مخطط يوضح نسب المساحات التي قامت بترميمها الوحدة التنفيذية بأمانة العاصمة

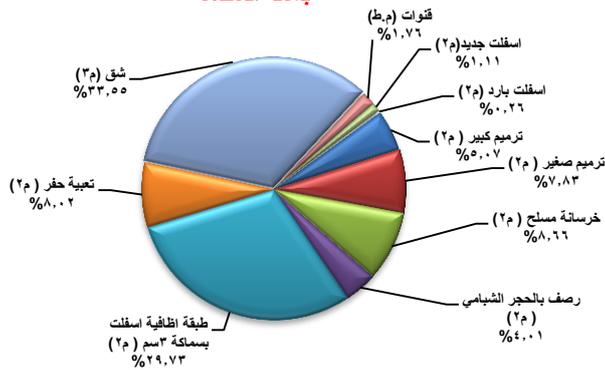

اجمالية المساحات التي قامت بترميمها الوحدة التنفيذية بأمانة العاصمة

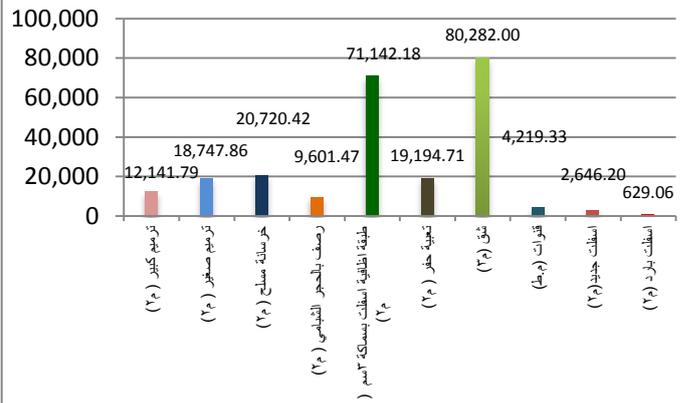

Date : التاريخ:

المحتويات	
١	الغلاف
٢	قائمة المحتويات
٣	مقدمة .
٤	أولاً: مهام واختصاصات الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة
٥-٧	ثانياً: أبرز التطورات الذي وصلت إليها الوحدة التنفيذية ومقارنتها بما كانت عليه سابقاً
٨	ثالثاً: الهيكل التنظيمي
٨-٢٠	٤-١ نشاط الوحدة التنفيذية وجداول ومخططات توضح المساحات المرمة من قبل الوحدة التنفيذية في مديريات امانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
٢١-٤٠	٤-٢ فعاليات الوحدة التنفيذية : - عقود الاعمال الموقعة بتمويل من صندوق صيانة الطرق. - عقود الاعمال الموقعة بتمويل من حساب السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% . - عقود الاعمال المنفذة من طوارئ امانة العاصمة. - عقود الاعمال المنفذة من المبادرات المجتمعية. - عقود الاعمال المنفذة بتمويل من محافظة صنعاء – المجلس التنسيقي. - الاعمال المنفذة بتمويل من الوحدة التنفيذية بتمويل ذاتي حتى يتم استكمال اعتمادها من الامانة
٤١	رابعاً: نشاط الوحدة التنفيذية لسنة ٢٠٢١
٤٢-٤٣	خامساً: التراخيص المتعلقة بأعمال الحفريات الخاصة بخدمات المواطنين والجهات الخدمية.
٤٤-٤٥	سادساً: المعوقات والمشاكل .
	سابعاً: التوصيات
	المرفقات
	ملحق بالتفاصيل للمشاريع والصور الفوتوغرافية قرار الانشاء للوحدة التنفيذية واللائحة التنظيمية



Date : التاريخ:

مقدمة:

منذ بداية العدوان على بلادنا وزيادة الكثافة السكانية بالمدينة ضعف الكثافة السكانية الطبيعية قبل العدوان مما أدى الى زيادة الاعباء على امانة العاصمة في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين ومن اهمها البنية التحتية للشوارع الداخلية بالأمانة ونظرا للحاجة الى تمثيل اطار عمل متكامل وجهة تنسيقية لتوجيه وتنفيذ التدخلات الهادفة الى الحفاظ على شبكة الطرق والانفاق والجسور والارصفة والساحات والبيادين والمباني الواقعة في الاطار الجغرافي لأمانة العاصمة من خلال تنفيذ اعمال الصيانة بأنواعها المختلفة بصورة منتظمة وتحسين الاستجابة السريعة للأجهزة الضبطية للحد من الحفريات العشوائية والغير مرخصة فان الامر يستحق التفكير في اجراءات لمواجهة التحدي ومن هذه الاجراءات جاءت فكرة إنشاء الوحدة التنفيذية للصيانة والترميم بأمانة العاصمة صنعاء وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري .



Date : التاريخ:

أولاً: مهام واختصاصات الوحدة التنفيذية للصيانة والترميم :

١. تنفيذ المسوحات الدورية لمعرفة الوضع الحالي لشبكة الطرق والجسور والاتفاق والساحات والبيادين والمباني العامة في الامانة وتحديد معايير يمكن استخدامها في تحقيق متطلبات الصيانة.
٢. متابعة الاجهزة المركزية والمحلية الخدمية وتفعيل اليات التنسيق والعمل معها بهدف وضع الية شاملة للتنسيق بين الجهات عند تنفيذ المشاريع لتوفير اطار عمل كلي ومنسق للاستجابة للتحديات للحد من الحفریات المتكررة في شبكة الطرقات والارصفة والساحات والبيادين القائمة بالأمانة.
٣. منح التراخيص والرقابة والاشراف على حفریات التمديدات التابعة للجهات الخدمية وتنفيذ اعمال اعادة ترميمها وفقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة وعلى نفقة الجهة المستفيدة.
٤. منح التراخيص المتعلقة بأعمال الحفریات الخاصة بخدمات المواطنين وتنفيذ اعمال اعادة ترميمها وفقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة وعلى نفقة المستفيد.
٥. تنفيذ اعمال وصيانة وترميم الحفریات في عموم مديريات الامانة ومواجهة تكلفتها من المخصصات المالية المرصودة في موازنة كل مديريةية على حدة.
٦. تنفيذ اعمال صيانة الجسور والاتفاق ومواجهة تكلفتها من الموارد المخصصة والمعتمدة لهذا الغرض.
٧. تنفيذ اعمال صيانة وترميم الحفریات الطارئة من معدل دخل الفائدة المحقق للوحدة عن المشاريع الاستثمارية.
٨. تنفيذ اعمال صيانة المباني العامة ومواجهة تكلفتها من الموازنة المخصصة والمعتمدة لهذا الغرض.
٩. صيانة المعدات وتجديد اسطولها من معدل دخل الفائدة للوحدة التنفيذية.
١٠. إنشاء وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة .



Date : التاريخ:

ثانياً: إبراز التطورات الذي وصلت إليها الوحدة التنفيذية ومقارنتها بما كانت عليه سابقاً :-

✓ الوضع السابق للوحدة التنفيذية:

- ❖ الوحدة التنفيذية كانت تعاني من ضعف الإمكانيات والمعدات والكوادر لإعادة الحفریات المرخصة .
- ❖ كانت الوحدة التنفيذية عبارة عن غرفتين فقط يعمل فيها أشخاص بعدد الأصابع (مدير عام تنفيذي + نائب تنفيذي + مدير التراخيص + مدير إدارة الصيانة للشوارع الاسفلتية) فقط، إضافة الى معدات تمثلت في (قلاب واحد حمولة ١٦ طن شبه منتهي + قلاب واحد حمولة ٣ طن + وايت ماء حمولة ٥٠٠٠ لتر + جهاز كمبيوتر واحد + آلة تصوير واحدة) وعمال أيضاً بعدد الأصابع يتم استعارتهم من إدارة الترميمات بمكتب الأشغال بالأمانة.
- ❖ سابقاً لم يتم تطوير الوحدة التنفيذية في أي مجال لا ادارياً أو فنياً أو حتى من ناحية الإمكانيات.
- ❖ أيضاً كان هناك عشوائية في المشاريع التي كان جاري تنفيذها من ناحية قصور الدراسات والتصاميم لتلك المشاريع من قبل الجهات المالكة .
- ❖ رغم كل ما ذكرناه سابقاً سعينا وبتلك الإمكانيات انجاز تلك المشاريع وتوقيع عقود عدد آخر من المشاريع الجديدة حينها رغم القصور الواضح فيها من الدراسة والتصميم ولكن كان هدفنا هو إنجازها للاستفادة من أرباحها في البدء بتطوير الوحدة التنفيذية خطوة خطوة.

✓ الوضع الحالي للوحدة التنفيذية:

فعلاً ورغم شحة الإمكانيات للدولة سعينا الى كسب الكوادر الشابّة والمجاهدة إضافة الى الموظفين السابقين حتى استطعنا أن نصل الى ما كنا نصبوا اليه بخطوات مدروسة وبجهد غير عادي بفضل من الله وتوفيقه والعمل كخلية نحل حيث أن الواحد من تلك الكوادر كان يعمل ليلاً ونهاراً بجهد عشرة أشخاص لمضاعفة الإنتاج وتنفيذاً لوصية الشهيد الرئيس صالح محمد الصماد تحت شعار (يدّ تبني ويدّ تحمي) وبدعم من القيادة السياسية استطعنا تحقيق العديد من المكاسب الملموسة لوطننا اليمن الجريح نسردها فيما يلي:

❖ أولاً: في الجانب الإداري:

- تم انشاء إدارة المباني والسلامة المرورية.
- تم انشاء إدارة المشاريع والدراسات والعقود.
- تم انشاء إدارة التخطيط والمتابعة والاحصاء.
- تم انشاء إدارة الرقابة والتفتيش.
- تم انشاء إدارة الموارد البشرية.
- تم انشاء إدارة الشؤون القانونية.
- تم انشاء إدارة الحركة.
- تم انشاء إدارة المشتريات والمخازن.
- تم إدخال نظام البصمة.
- تم إدخال نظام الأتمتة.



Date : التاريخ:

- الأنظمة المختصة بتقنية المعلومات.
- النظام المحاسبي ونظام المشاريع الرأسمالية.

❖ ثانياً: في الجانب الفني:

- يوجد حالياً لدى الوحدة التنفيذية العديد من الفرق الميدانية والمتخصصة منها في مجال الأعمال الطارئة وصيانة الشوارع الاسفلتية وتنظيف قنوات تصريف مياه الامطار وكذلك المصائد، ومنها في مجال مشاريع الجسور السطحية والرصف الحجري وأخرى في مجال المباني والسلامة المرورية.
- تمتلك الوحدة التنفيذية حالياً جرافس للمعدات بشوارع نواكشوط وتشوين المواد من بيسكورس وغيره.
- تمتلك الوحدة التنفيذية حالياً معدات أضعاف مضاعفة عما كان لديها في السابق من خلال شراء تلك المعدات إضافة الى استلام معدات الترميم بمكتب الاشغال بالأمانة.
- القيام بعمل عدة ورشات تدريبية في المجالات الفنية والإدارية وتقنية المعلومات.
- تدريب معظم الكوادر الفنية والإدارية من خلال الدورات.
- الآن أصبح بمقدور كوادر الوحدة لتنفيذ تنفيذ العديد من المشاريع في شتى المجالات إنشاء أو صيانة جودة وكفاءة عالية وفي فترات قياسية.
- وللعلم فإن كل تلك الإنجازات تحققت عبر إدارات معظمها ما زالت تدار حتى الآن بشخص واحد ووجود أدارتين أو أكثر في مكتب واحد.

❖ ثالثاً: ما حققته الوحدة التنفيذية من تطوير وإنشاء واكتساب أصول من أرباحها:

- إعادة التزامات سابقة للبيارات المرخصة من سابق.
- صرف حوافز وأجور للموظفين.
- تأهيل وتجهيز الجرافس بشوارع نواكشوط.
- بناء محطة للمحروقات.
- بناء استراحة ومخازن في الجرافس.
- تأثيث كل الإدارات ورفدها بأجهزة كمبيوتر وآلات تصوير.
- اكتساب وشراء معدات خفيفة من مناشير ودكاكات صغيرة وغيرها.
- البناء المؤسسي وتأهيل الكوادر.
- شراء أجهزة GPS وعمل اسقاطات لجميع الاعمال التي تم تنفيذها.



Date : التاريخ:

❖ رابعاً: ما أنجزته وتنجزه الوحدة التنفيذية من مشاريع على حساب الوحدة ذاتياً:


- ترميم وصيانة الهبوطات في معظم شوارع الأمانة.
- تنفيذ كرفانة دار الحديد.
- رفع مخلفات المتواجدة في القرش المسلم لها بشوارع نواكشط.

❖ خامساً: ما أنجزته الوحدة التنفيذية من مشاريع عبر السلطة المحلية بالأمانة:

قامت الوحدة التنفيذية تنفيذ عدد (٥٧) مشروع بإجمالي قيمة تعاقدية بمبلغ (3,775,472,295.33) ثلاثة مليار وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون واربعمائة واثنان وسبعون الف ومئتان وخمسة وتسعون ريال وثلاثة وثلاثون فلساً وقد تم إنجاز هذه المشاريع والتي بلغت نسبة الانجاز (٧٣,٦%) وبمبلغ إجمالي وقدره (2,744,768,827.70) اثنان مليار وسبعمائة واربعين مليون وسبعمائة وثمانية وستون الف وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال وسبعون فلساً وهي موضحة بالجدول التالي :-

البيان / السنة	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨ م بعدد مشروع واحد	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩ م بعدد مشروع واحد	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠ م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١ م
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	158,341,056.00	98,935,200.00	924,046,258.39	1,598,446,313.31

مستوى تنفيذ الوحدة التنفيذية خلال السنوات بالريال اليمني

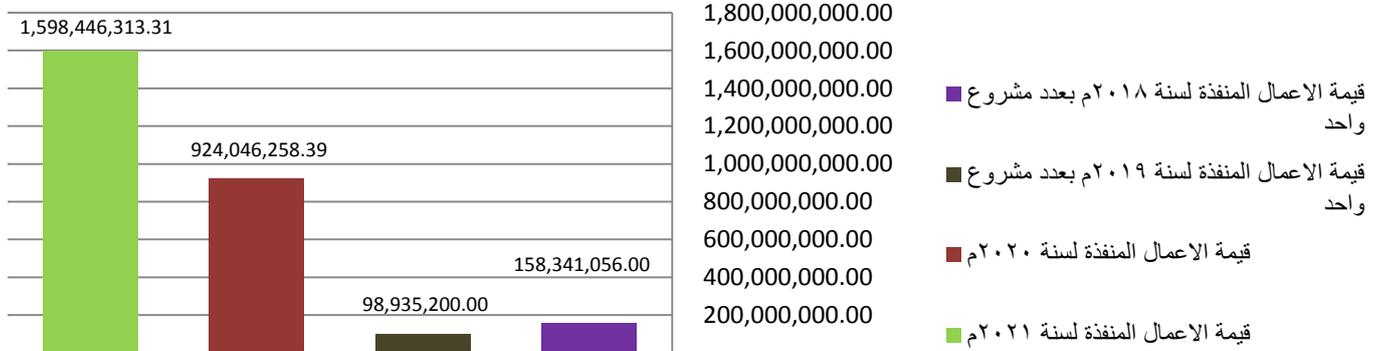

قيمة الاعمال المنفذة قيمة الاعمال المنفذة قيمة الاعمال المنفذة قيمة الاعمال المنفذة
سنة ٢٠١٨ م بعدد مشروع واحد لسنة ٢٠١٩ م بعدد مشروع واحد لسنة ٢٠٢٠ م لسنة ٢٠٢١ م



Date : التاريخ:

ثالثا: الهيكل التنظيمي :

سيتم عمل الهيكل التنظيمي الجديد وفق قرار الوحدة الجديد الصادر من رئيس المجلس السياسي الاعلى رقم (٦٣) لسنة ٢٠٢١ م

رابعا: نشاط الوحدة التنفيذية بالأمانة خلال السنوات ٢٠١٨م - ٢٠١٩م - ٢٠٢٠م - ٢٠٢١م :

١-٤ نشاط ادارة الوحدة التنفيذية :

- ❖ تدار الوحدة التنفيذية من قبل إدارة متفرغة ذات خبرات عالية برئاسة امين العاصمة – رئيس المجلس المحلي وبإشراف وكيل قطاع الاشغال العامة والمشاريع ويتكون طاقمها من المدير العام التنفيذي ونائبه ومدراء الادارات والسكرتارية بالإضافة إلى التعاقد مع خبرات متوفرة محليا وغير متفرغة للاستفادة من خبراتها بحسب الاحتياج.
- ❖ تقوم إدارة الوحدة التنفيذية بإتباع منهجية للعمل تتيح المشاركة الجماعية والعمل كفريق واحد من خلال إشراك المختصين في مناقشة الأمور المتعلقة بالوحدة التنفيذية والتأكيد على انجاز الأعمال أولا بأول وبمستوى أداء عال وغير مقيد بساعات العمل الرسمية حيث تتطلب بعض المهام التواجد خارج أوقات الدوام في المكتب أو المتابعة الميدانية للأنشطة المختلفة .



٤-١ نشاط الوحدة التنفيذية وجداول ومخططات توضح المساحات المرمة من قبل الوحدة التنفيذية في مديريات امانة العاصمة ومحافظة صنعاء:


جدول يوضح المساحات التي تم ترميمها واستهدافها من قبل الوحدة التنفيذية بأمانة العاصمة للفترة من ٢٠٢٠/٣/١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ م:

جدول يوضح اجمالي المساحات بالمتر المربع التي قامت بترميمها الوحدة التنفيذية للصيانة والترميم بجميع شوارع وتقاطعات أمانة العاصمة


نوع الترميم	ترميم كبير (٢م)	ترميم صغير (٢م)	خرسانة مسلح (٢م)	رصف بالحجر الشبامي (٢م)	طبقة اظافية اسفلت بسماكة ٣سم (٢م)	تعبية حفر (٢م)	شق (٣م)	قنوات (م.ط)	اسفلت جديد (٢م)	اسفلت بارد (٢م)
كمية الترميم (٢م)	12,141.79	18,747.86	20,720.42	9,601.47	71,142.18	19,194.71	80,282.00	4,219.33	2,646.20	629.06



مخطط بياني يوضح اجمالي المساحات التي قامت بترميمها الوحدة التنفيذية بأمانة العاصمة

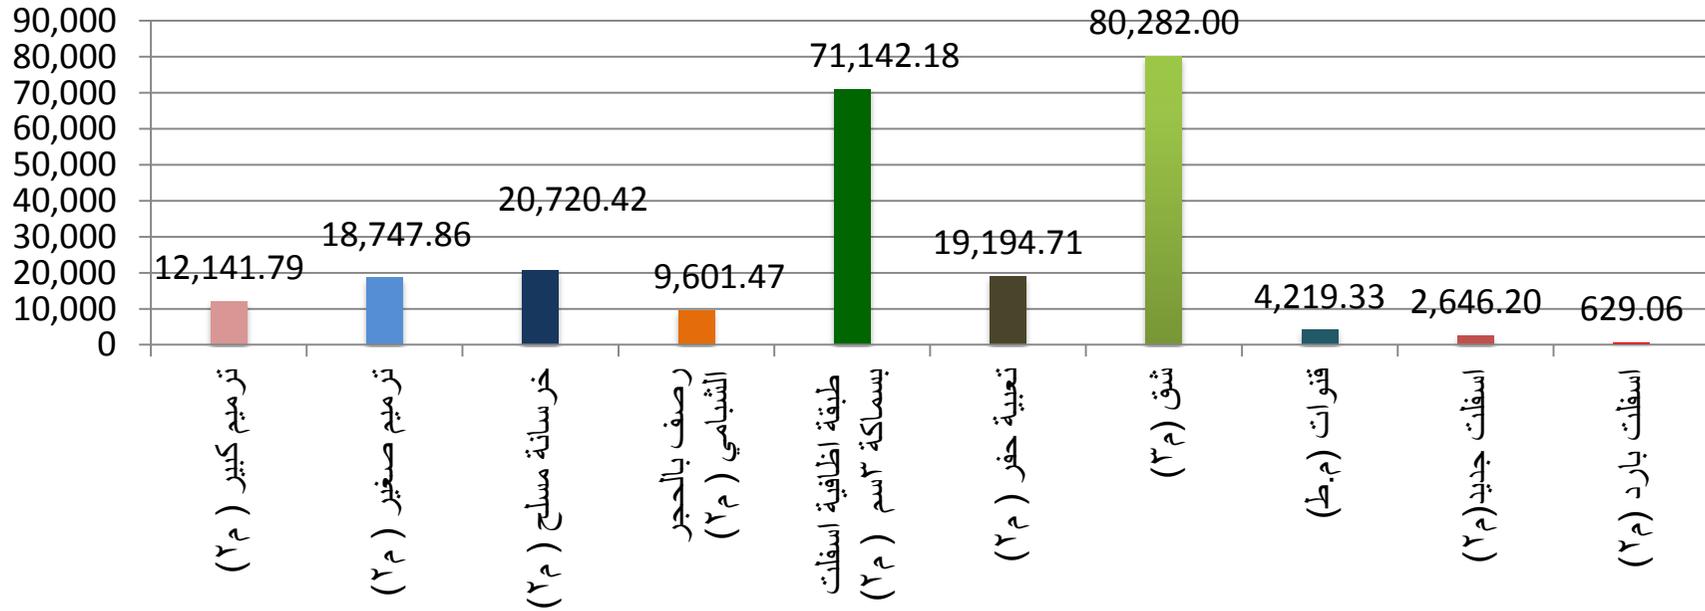

مخطط يوضح نسب المساحات التي قامت بترميمها الوحدة التنفيذية بأمانة العاصمة

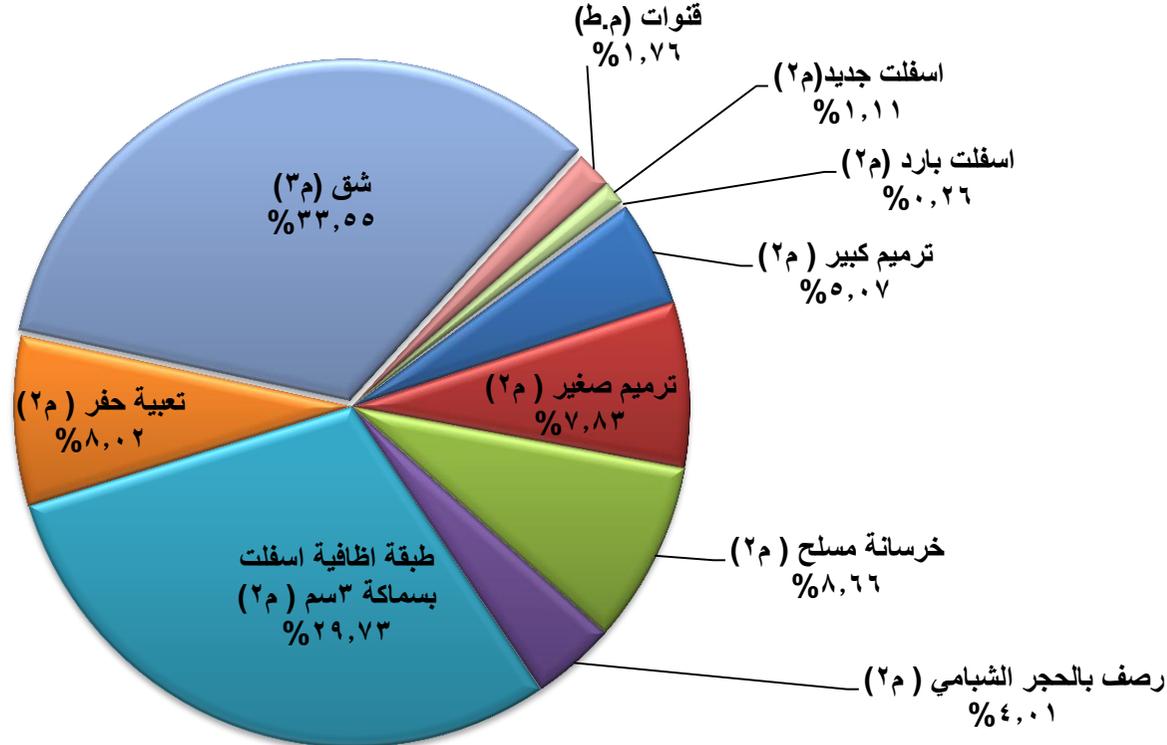

جدول يوضح المساحات التي تم ترميمها واستهدافها من قبل الوحدة التنفيذية بأمانة العاصمة على مستوى كل مديريةية للفترة من ٢٠٢٠/٣/١ م الى ٢٠٢١/١٢/٣١ م :

اسفلت بارد (٢م)	اسفلت جديد (٢م)	قنوات (م. ط)	شق (٣م)	تعبية حفر (٢م)	طبقة اضافية اسفلت بسمائة ٣سم (٢م)	رصف بالحجر الشامي (٢م)	خرسانة مسلح (٢م)	ترميم صغير (٢م)	ترميم كبير (٢م)	اسم المديرية
0.00	96.20	0.00	6,000.00	1,949.08	19,845.93	0.00	573.23	5,414.76	3,146.44	مديرية الثورة
0.00	0.00	44.00	0.00	1,822.62	105.00	2,408.96	5,170.58	980.48	1,721.74	مديرية شعوب
0.00	2,550.00	0.00	0.00	1,822.62	105.00	0.00	3,549.03	1,936.30	669.33	مديرية ازال
333.00	0.00	0.00	16,870.00	1,822.62	21,948.00	1,420.00	3,318.28	557.47	2,286.33	مديرية السبعين
0.00	0.00	535.00	26,000.00	2,301.70	105.00	0.00	573.23	446.74	764.24	مديرية بني الحارث
0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.62	105.00	0.00	573.23	1,608.70	330.33	مديرية صنعاء القديمة





اسفلت بارد (٢م)	اسفلت جديد (٢م)	قنوات (م. ط)	شق (٣م)	تعبية حفر (٢م)	طبقة اضافية اسفلت بسمائة ٣سم (٢م)	رصف بالحجر الشامي (٢م)	خرسانة مسلح (٢م)	ترميم صغير (٢م)	ترميم كبير (٢م)	اسم المديرية
0.00	0.00	3,640.33	31,412.00	2,102.97	105.00	0.00	573.23	3,807.25	2,269.48	مديرية معين
69.06	0.00	0.00	0.00	1,905.22	3,150.00	5,772.51	3,857.08	840.37	99.33	مديرية الوحدة
227.00	0.00	0.00	0.00	1,822.62	25,568.25	0.00	573.23	2,357.51	248.24	مديرية التحرير
0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.62	105.00	0.00	1,959.33	348.30	99.33	مديرية الصافية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	507.00	محافظة صنعاء
629.06	2,646.20	4,219.33	80,282.00	19,194.71	71,142.18	9,601.47	20,720.42	18,747.86	12,141.79	الاجمالي الكلي





مخططات توضح المساحات التي تم ترميمها واستهدافها من قبل الوحدة التنفيذية بأمانة العاصمة على مستوى كل مديريةية للفترة من ٢٠٢٠/٣/١ م الى ٢٠٢١/١٢/٣١ م :



الصفحة ١٤

Sana'a AL-Twfiq S.t Tel: 01- 483380


العنوان : صنعاء - شارع التوفيق ت: 01-483380

م/ محمد صالح العبدى - مدير ادارة الدراسات والمشاريع والعقود
م / عبدالملك شريف الأنسى - المدير العام التنفيذي


م / هشام حساني .
م/ رضوان العمري - نائب المدير العام
م/ ابراهيم البجم - مدير ادارة التراخيص


اعداد : أ/ صالح الزهري -اعلامي الوحدة
اشراف : أ / عبدالملك مكرم - النائب المالي

مخطط يوضح المساحة المرممة ونوعها لمديرية الثورة

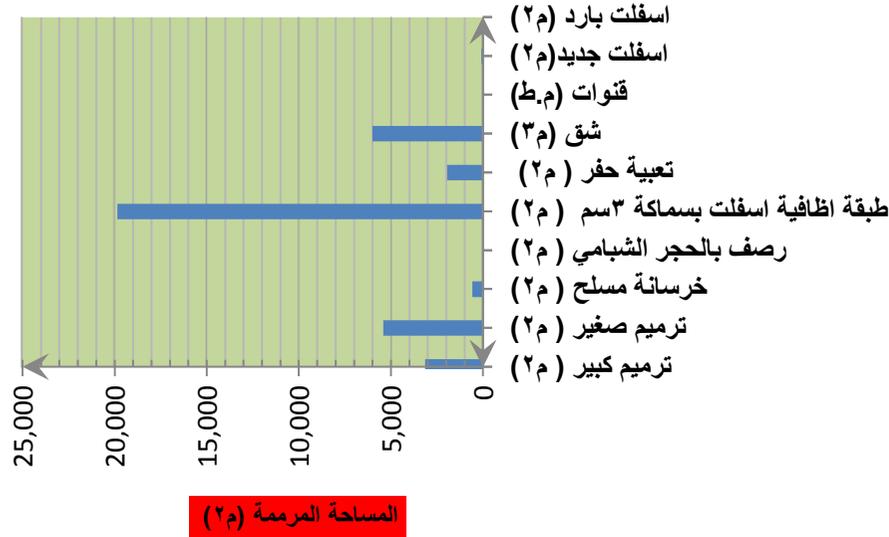


مخطط يوضح المساحة المرممة ونوعها لمديرية شعوب

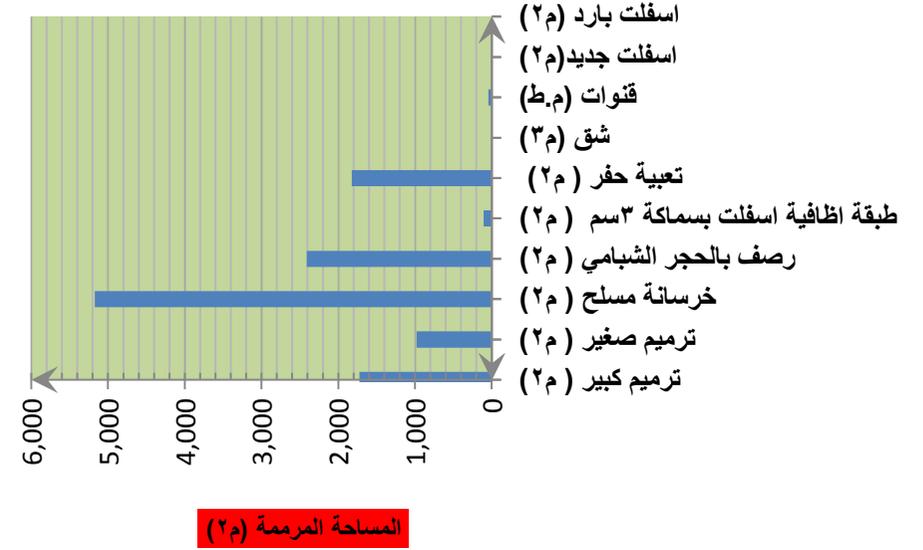


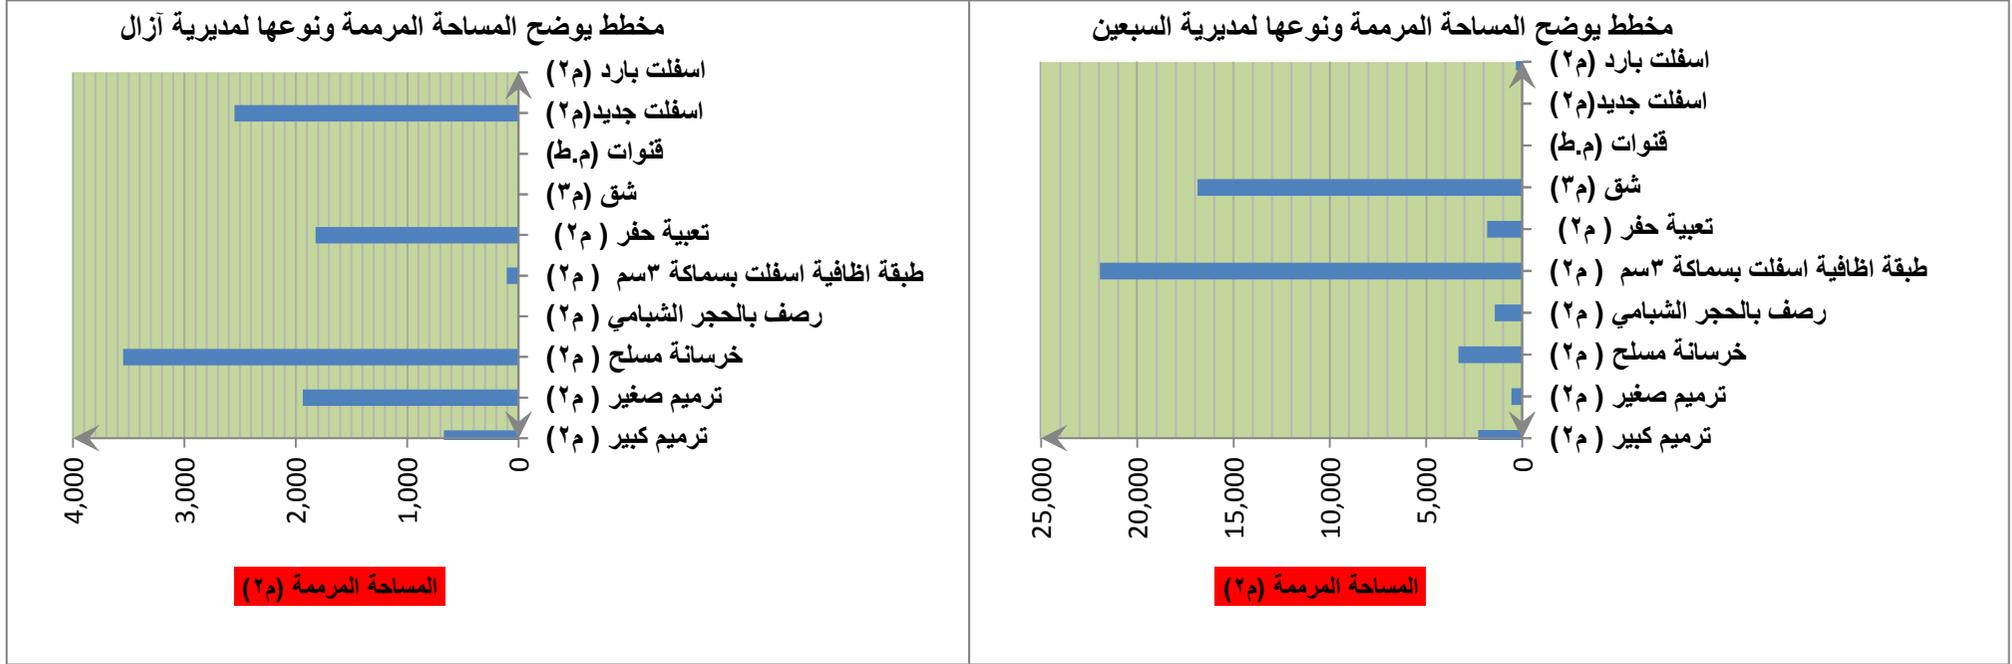


مخطط يوضح المساحة المرممة ونوعها لمديرية بني الحارث

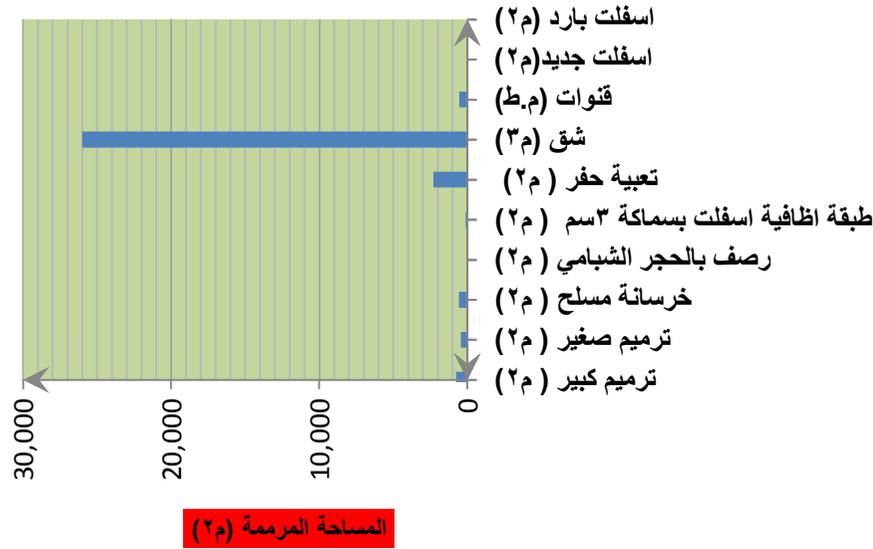


مخطط يوضح المساحة المرممة ونوعها لمديرية صنعاء القديمة

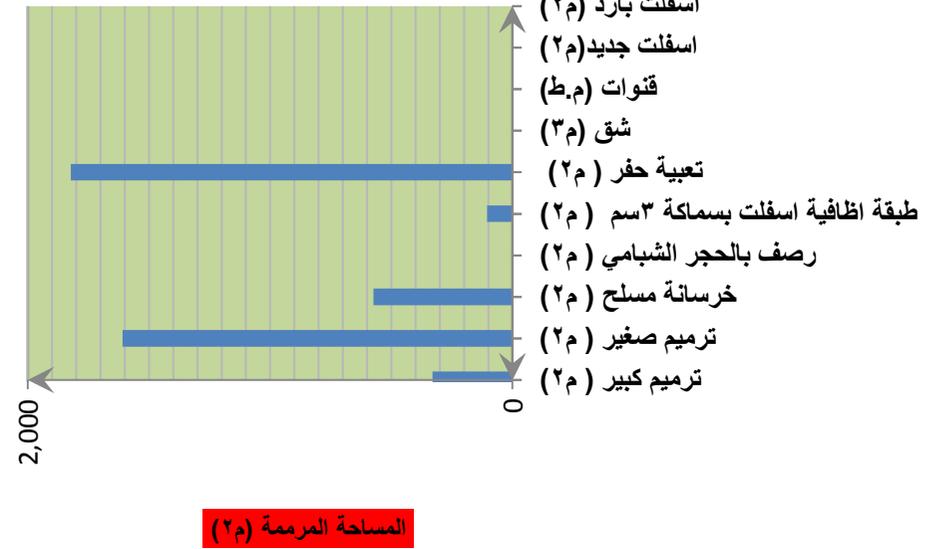


مخطط يوضح المساحة المرمة ونوعها لمديرية معين

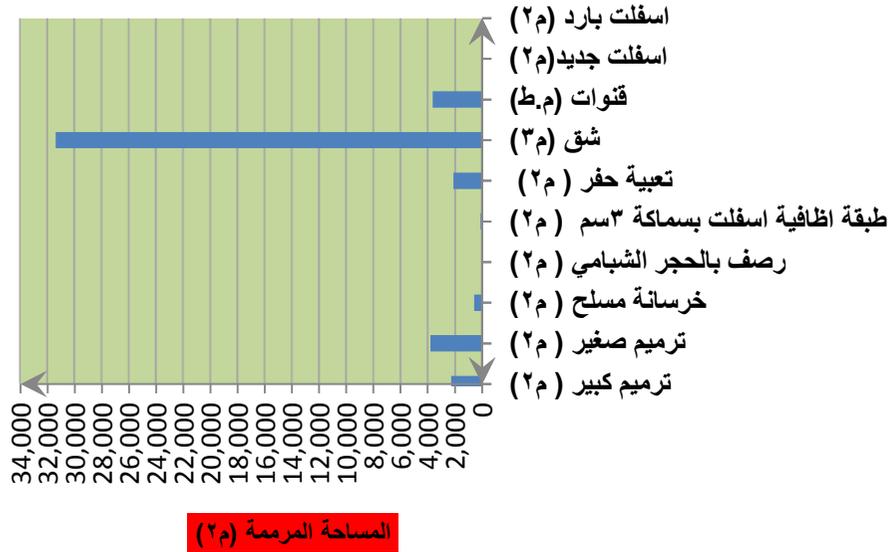


مخطط يوضح المساحة المرمة ونوعها لمديرية الوحدة

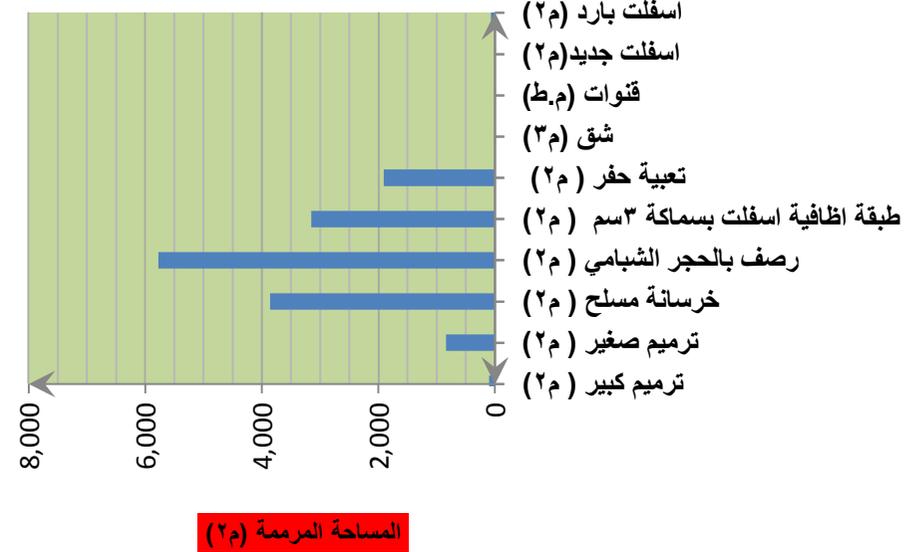

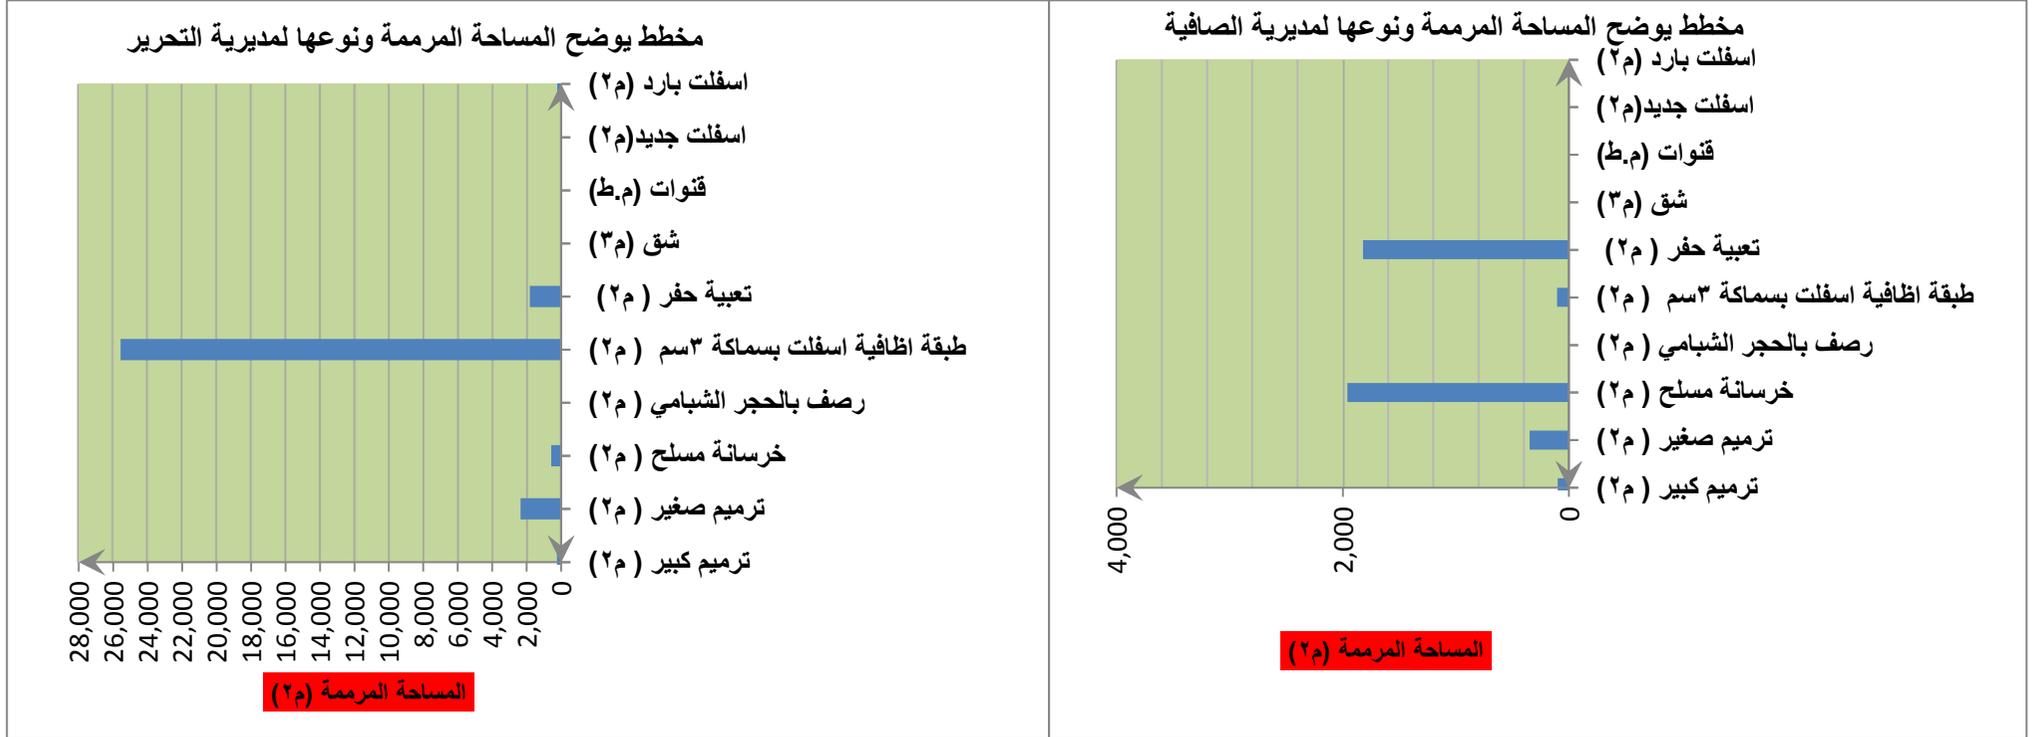

مخطط يوضح المساحة المرمنة ونوعها لمحافظة صنعاء

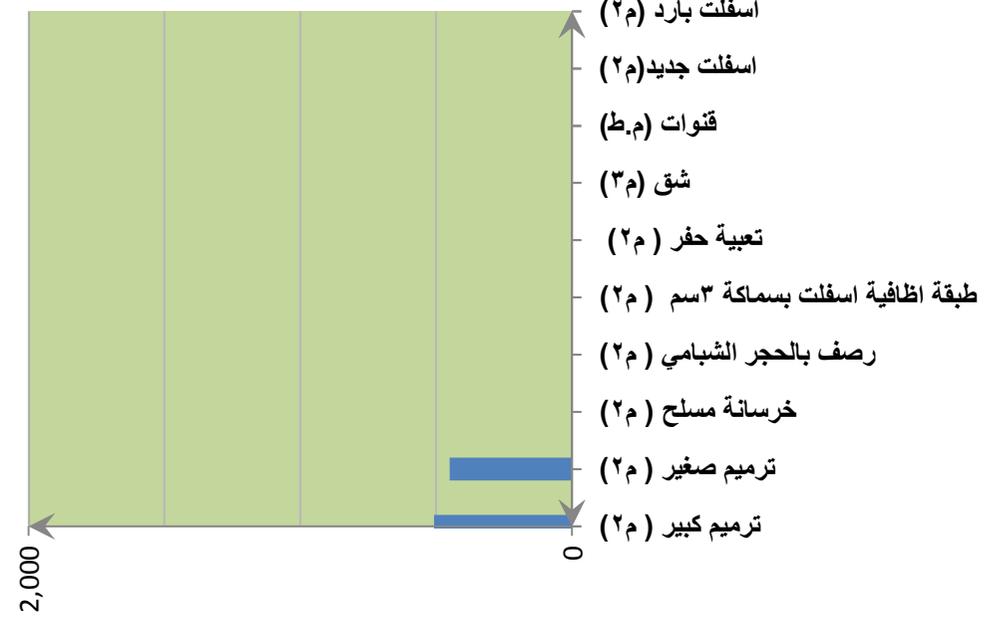


Date : التاريخ:

❖ ما أنجزته الوحدة التنفيذية من مشاريع:

قامت الوحدة التنفيذية تنفيذ عدد (٥٧) مشروع بإجمالي قيمة تعاقدية بمبلغ (3,775,472,295.33) ثلاثة مليار وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون واربعمائة واثنان وسبعون الف ومئتان وخمسة وتسعون ريال وثلاثة وثلاثون فلسا وقد تم انجاز هذه المشاريع والتي بلغت نسبة الانجاز (٧٣,٦%) وبمبلغ اجمالي وقدره (2,744,768,827.70) اثنان مليار وسبعمائة واربعه واربعون مليون وسبعمائة وثمانية وستون الف وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال وسبعون فلسا وهي موضحة بالجدول التالي :-

البيان / السنة	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨ م بعدد مشروع واحد	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩ م بعدد مشروع واحد	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠ م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١ م
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	158,341,056.00	98,935,200.00	924,046,258.39	1,598,446,313.31

مستوى تنفيذ الوحدة التنفيذية خلال السنوات بالريال اليمني

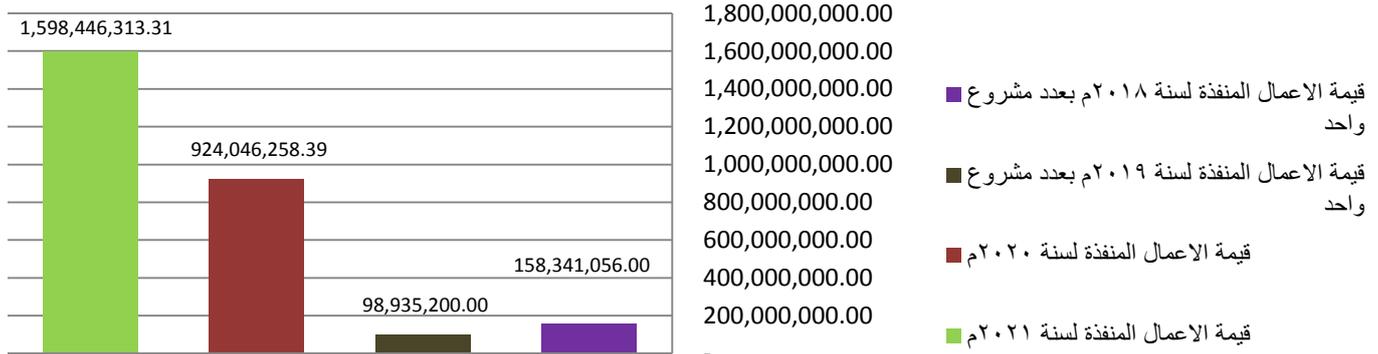

قيمة الاعمال المنفذة قيمة الاعمال المنفذة قيمة الاعمال المنفذة قيمة الاعمال المنفذة
لسنة ٢٠١٨ م بعدد مشروع واحد لسنة ٢٠١٩ م بعدد مشروع واحد لسنة ٢٠٢٠ م لسنة ٢٠٢١ م

٤-٢ فعاليات الوحدة التنفيذية للسنة ٢٠٢١ م :

نفذت الوحدة التنفيذية المسوحات الدورية لمعرفة الوضع الحالي لشبكة الطرق والجسور والانفاق والساحات والميادين والمباني العامة في الامانة وتحديد معايير يمكن استخدامها في تحقيق متطلبات الصيانة وتم التنسيق مع الجهات الممولة المحلية والخارجية وذلك لتوفير التمويل اللازم لصيانة وترميم شبكة الطرق والجسور والانفاق والساحات والميادين والمباني العامة.



Date : التاريخ:

٤-٢-١ حيث قامت الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة بتنفيذ العديد من المشاريع عبر إبرامها للعقود مع الجهات التالية :

- عقود الاعمال الموقعة بتمويل من صندوق صيانة الطرق.
- عقود الاعمال الموقعة بتمويل من حساب السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥%.
- عقود الاعمال المنفذة من طوارئ امانة العاصمة.
- عقود الاعمال المنفذة من المبادرات المجتمعية.
- عقود الاعمال المنفذة بتمويل من محافظة صنعاء – المجلس التنسيقي.
- الاعمال المنفذة بتمويل من الوحدة التنفيذية بتمويل ذاتي حتى يتم استكمال اعتمادها من الامانة.

٤-٢-٢ جدول تفصيلي يوضح المشاريع المنفذة من قبل الوحدة التنفيذية ونسب الانجاز لهذه المشاريع :-



Date : التاريخ:

مستل	اسم المشروع وموقعه	تاريخ العقد	مدة العقد	قيمة العقد	قيمة الأعمال المنفذة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م	نسبة الانجاز التراكمي	جهة التمويل	تاريخ الاستلام الابتدائي	اجمالي قيمة المستخلصات المصروفة ماليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م	نسبة المصروف ماليا من المشروع تراكمي	قيمة الضمانات المحتجزة	ملاحظات	قيمة الأعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨ م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٨ م	قيمة الأعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩ م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٩ م	قيمة الأعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠ م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢٠ م	قيمة الأعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١ م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢١ م
1	ترميم الشوارع الواقعة في حدود المربع الواقع من جولة آية حتى جولة العمري مروراً بشوارع الأربعين سعوان ، ومن جولة آية شارع مارب حتى مستشفى الثورة مروراً بالمشهد (القطاع الشرقي)	2018		220,599,220.00	158,341,056.00	71.78%	صندوق الصيانة من موازنة ٢٠١٨ م		134,216,260.00	60.84%	14,504,478.00		158,341,056.00	71.78%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2	ترميم الحفرات بالشوارع الرئيسية التي لم تدخل باليونس للعام ٢٠١٩ م	17/06/2019	تسعة أشهر	100,012,000.00	98,935,200.00	98.92%	صندوق الصيانة موازنة ٢٠١٩ م		79,880,016.00	79.87%	9,777,523.00		0.00	0.00%	98,935,200.00	98.92%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	ترميم الحفانر في شوارع وناقص وجسور امالة العاصمة (المجموعة الثانية)	18/05/2020	سنة أشهر	249,706,650.00	201,493,819.39	80.69%	صندوق الصيانة موازنة ٢٠٢٠ م		125,484,232.49	50.25%	8,535,516.70	استكمال بوفع الامر التغيري و صرف المستخلصات	0.00	0.00%	0.00	0.00%	108,039,860.00	43.27%	93,453,959.39	37.43%
4	صيانة وترميم الشوارع في مربع حي الزراعة - مديرية معين	26/02/2020	أشهر (4)	100,000,022.00	87,958,949.66	87.96%	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠١٩ م	05/07/2021	83,561,002.09	83.56%	4,397,947.48	تم الاستلام الابتدائي	0.00	0.00%	0.00	0.00%	86,037,671.00	86.04%	1,921,278.66	1.92%



Date : التاريخ:

مستل	اسم المشروع وموقعه	5	6	7	8
تاريخ العقد	25/02/2020	25/02/2020	26/02/2020	01/07/2020	
مدة العقد	أشهر (4)	أشهر (4)	أشهر (4)	أشهر (5)	
قيمة العقد	30,000,501.00	58,245,058.00	50,000,320.00	37,000,072.00	
قيمة الاعمال المنفذة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١	30,000,501.00	59,025,502.01	49,360,658.59	36,999,042.00	
نسبة الاجاز التراكمي	100.00%	101.34%	98.72%	100.00%	
جهة التمويل	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠١٩م	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠١٩م	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠١٩م	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠١٩م	
تاريخ الاستلام الابتدائي	06/02/2021	17/02/2021	13/04/2021	08/03/2021	
اجمالي قيمة المستخلصات المصروفة ماليًا شاملاً الدفعة المقدمة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١	28,500,475.94	56,074,226.91	46,892,625.66	35,149,089.90	
نسبة المصروف ماليًا من المشروع تراكمي	95.00%	96.27%	93.78%	95.00%	
قيمة الضمانات المحتجزة	1,500,025.05	2,951,275.10	2,468,032.93	1,849,952.10	
ملاحظات	تم الاستلام الابتدائي	تم الاستلام الابتدائي	تم الاستلام الابتدائي	تم الاستلام الابتدائي	
قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨م	0.00	0.00	0.00	0.00	
نسبة الاجاز لسنة ٢٠١٨م	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩م	0.00	0.00	0.00	0.00	
نسبة الاجاز لسنة ٢٠١٩م	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠م	29,991,602.00	43,264,950.00	35,501,977.00	36,999,042.00	
نسبة الاجاز لسنة ٢٠٢٠م	99.97%	74.28%	71.00%	100.00%	
قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١م	8,899.00	15,760,552.01	13,858,681.59	0.00	
نسبة الاجاز لسنة ٢٠٢١م	0.03%	27.06%	27.72%	0.00%	



Date : التاريخ:

مسلسل	اسم المشروع وموقعه	9	10	11	12
تاريخ العقد	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	26/02/2020	05/09/2020
مدة العقد	أشهر (4)	أشهر (4)	أشهر (4)	أشهر (4)	أشهر (4)
قيمة العقد	50,000,320.00	70,000,036.00	60,000,075.00	90,000,370.00	90,000,370.00
قيمة الأعمال المنفذة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	0.00	15,198,317.50	59,947,545.00	89,999,494.00	89,999,494.00
نسبة الاجاز التراكمي	0.00%	21.71%	99.91%	100.00%	100.00%
جهة التمويل	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠١٩م	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠١٩م	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠١٩م	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠١٩م	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠١٩م
تاريخ الاستلام الابتدائي			20/02/2021	19/12/2020	19/12/2020
اجمالي قيمة المستحقات المصروفة حاليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	0.00	21,711,881.00	56,950,167.75	85,499,519.30	85,499,519.30
المشروع تراكمي	0.00%	31.02%	94.92%	95.00%	95.00%
قيمة الضمانات المحتجزة	0.00	2,171,188.10	2,997,377.25	4,499,974.70	4,499,974.70
ملاحظات	تم مناقشة للمعدات	تم مناقشة مع لعمالين لاستكمال العمل وعدم صرف الترخيصات لهم	تم الاستلام الابتدائي	تم الاستلام الابتدائي	تم الاستلام الابتدائي
قيمة الأعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨م	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
نسبة الاجاز لسنة ٢٠١٨م	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
قيمة الأعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩م	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
نسبة الاجاز لسنة ٢٠١٩م	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
قيمة الأعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠م	0.00	15,198,317.50	41,386,988.00	89,999,494.00	89,999,494.00
نسبة الاجاز لسنة ٢٠٢٠م	0.00%	21.71%	68.98%	100.00%	100.00%
قيمة الأعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١م	0.00	0.00	18,560,557.00	0.00	0.00
نسبة الاجاز لسنة ٢٠٢١م	0.00%	0.00%	30.93%	0.00%	0.00%



Date : التاريخ:

مستل	13	14	15	16
اسم المشروع وموقعه	صيانة وترميم الاسفلت في جولة الحظي وطريق وادي الاجبار مديرية سنحان وني بهلول	ترميم الشوارع الفرعية والرئيسية بالمديرية (ترميم شارع زايد وشارع ٢٤ شرق المستشفى الألماني - بني الحرث) المنقول لمشروع الرصيف شارع الحرية من تقاطع شارع القيادة حتى جسر السانلة - مديرية شعوب	مشروع استكمال الرصيف شارع الحرية من تقاطع شارع القيادة حتى جسر السانلة - مديرية شعوب	ترميم الشوارع الداخلية بالمديرية (شارع الامن القومي وشارع الكهرباء والشوارع الإسفلتية في وحدات جوار ١١٥-١١٤-١١٢-١١١ - صنعاء القديمة
تاريخ العقد	05/10/2020	05/09/2020	01/02/2021	05/09/2020
مدة العقد	٩٠ يوم	أشهر (4)	اربعة اشهر	أشهر (4)
قيمة العقد	13,664,000.00	30,000,295.00	35,535,329.60	20,000,540.00
قيمة الأعمال المنفذة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	12,535,903.92	29,945,815.11	30,255,245.34	20,299,114.63
نسبة الانجاز التراكمي	91.74%	99.82%	85.14%	101.49%
جهة التمويل	محلي - المحافظة	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠١٩م	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠١٩م	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠١٩م
تاريخ الاستلام الابتدائي		05/04/2021	05/04/2021	07/06/2021
اجمالي قيمة المستخلصات المصرفية شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	11,282,313.53	28,448,524.35	28,742,483.07	19,284,158.90
نسبة المصروف مالي من المشروع تراكمي	82.57%	94.83%	80.88%	96.42%
قيمة الضمانات المحتجزة	1,253,590.39	1,497,290.76	1,512,762.27	1,014,955.73
ملاحظات	الاستلام الابتدائي قريبا	تم الاستلام الابتدائي	تم الاستلام الابتدائي	تم الاستلام الابتدائي
قيمة الأعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨م	0.00	0.00	0.00	0.00
نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٨م	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
قيمة الأعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩م	0.00	0.00	0.00	0.00
نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٩م	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
قيمة الأعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠م	8,377,525.00	29,945,815.11	0.00	8,615,825.00
نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢٠م	61.31%	99.82%	0.00%	43.08%
قيمة الأعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١م	4,158,378.92	0.00	30,255,245.34	11,683,289.63
نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢١م	30.43%	0.00%	85.14%	58.41%



Date : التاريخ:

مستسل	17	18	19	20
اسم المشروع وموقعه	ترميم الشوارع الداخلية بالمديرية في وحدات جوار ٩١٣-٩٣١ - شعوب وسعوان مدينة العمال	تنفيذ جسر سطحي تقاطع شارع عمان والجزائر - مديرية الوحدة	الرصيف الحجري لشارع غرب جامع أبو بكر الصديق - مديرية الوحدة	الرصيف الحجري لتقاطع شارع نواكشوط مع شارع المحروقات - مديرية الوحدة
تاريخ العقد	05/09/2020	25/02/2020	25/02/2020	10/10/2020
مدة العقد	أشهر (4)	أشهر (4)	أشهر (4)	أشهر (4)
قيمة العقد	30,000,707.00	40,000,050.00	90,000,061.00	52,686,354.00
قيمة الاعمال المنفذة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	29,435,331.10	36,653,972.02	89,992,001.46	52,281,315.52
نسبة الانجاز التراكمي	98.12%	91.63%	99.99%	99.23%
جهة التمويل	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠١٩م	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠٢٠م	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠٢٠م	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠٢٠م
تاريخ الاستلام الابتدائي	10/12/2020	12/12/2020	03/05/2021	06/04/2021
اجمالي قيمة المستحقات المعصرة وقيمة مالياتيا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	27,963,564.55	34,821,273.42	85,492,401.38	49,667,249.74
نسبة المصروف مالياتيا من المشروع تراكمي	93.21%	87.05%	94.99%	94.27%
قيمة الضمانات المحتجزة	1,471,766.56	1,832,698.60	4,499,600.07	2,614,065.78
ملاحظات	تم الاستلام الابتدائي	تم الاستلام الابتدائي	تم الاستلام الابتدائي	تم الاستلام الابتدائي
قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨م	0.00	0.00	0.00	0.00
نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٨م	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩م	0.00	0.00	0.00	0.00
نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٩م	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠م	29,435,331.10	36,653,972.02	46,201,831.00	35,845,740.00
نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢٠م	98.12%	91.63%	51.34%	68.04%
قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١م	0.00	0.00	43,790,170.46	16,435,575.52
نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢١م	0.00%	0.00%	48.66%	31.20%



Date : التاريخ:

مسلسل	21	22	23	24
اسم المشروع وموقعه	تنفيذ جسر سطحي تقاطع شارع ٤٥ مع شارع الثلاثين الرئاسة - مديرية السبعين	تنفيذ اعمال الجسر السطحي شارع الستين الجنوبي امام مبنى اليمينيات مديرية الوحدة	اعمال الطوارئ (اعمال الطوارئ للحد من اضرار سيول مياه الامطار في شوارع امانة العاصمة للعام ٢٠٢٠ - المجموعة الثانية)	مشروع صيانة وترميم شارع العدل (من تقاطع جولة الجامعة الى دائرة التوجيه المعنوي -جولة الراح) - مديرية التحرير
تاريخ العقد	25/02/2020	10/10/2020	27/07/2020	04/11/2020
مدة العقد	أشهر (4)	أشهر (4)	شهرين	أشهر (4)
قيمة العقد	71,677,339.50	65,981,851.50	40,559,804.00	170,630,624.00
قيمة الاعمال المنفذة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	73,459,100.66	65,816,487.85	40,559,804.00	164,285,258.79
نسبة الانجاز التراكمي	102.49%	99.75%	100.00%	96.28%
جهة التمويل	الطوارئ من موازنة ٢٠٢٠م - ٢٠٢١م	الطوارئ من موازنة ٢٠٢٠م - ٢٠٢١م	الطوارئ من موازنة ٢٠٢٠م - ٢٠٢١م	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠٢٠م
تاريخ الاستلام الابتدائي	15/12/2020	22/02/2021	27/09/2020	06/09/2021
اجمالي قيمة المستخلصات المصروفة ماليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	69,786,145.62	62,525,663.46	40,559,804.00	156,070,995.89
نسبة المصروف ماليا من المشروع تراكمي	97.36%	94.76%	100.00%	91.47%
قيمة الضمانات المحتجزة	3,672,955.03	3,290,824.39	0.00	8,214,262.90
ملاحظات	تم الاستلام الابتدائي	تم الاستلام الابتدائي	تم الاستلام الابتدائي	تم الاستلام الابتدائي
قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨م	0.00	0.00	0.00	0.00
نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٨م	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩م	0.00	0.00	0.00	0.00
نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٩م	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠م	73,459,100.66	52,531,413.00	40,559,804.00	11,000,000.00
نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢٠م	102.49%	79.61%	100.00%	6.45%
قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١م	0.00	13,285,074.85	0.00	153,285,258.79
نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢١م	0.00%	20.13%	0.00%	89.83%



Date : التاريخ:

مسلسل	اسم المشروع وموقعه	تاريخ العقد	مدة العقد	قيمة العقد	قيمة الاعمال المنفذة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	نسبة الانجاز التراكمي	جهة التمويل	تاريخ الاستلام الابتدائي	اجمالي قيمة المستحقات المصروفة ماليًا شاملًا الدفعة المقدمة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	نسبة المصروف ماليًا من المشروع تراكمي	قيمة الضمانات المحتجزة	ملاحظات	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٨م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٩م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢٠م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢١م
25	مشروع صيانة وترميم شارع تونس (من تقاطع شارع العال وحتى تقاطع شارع الدائري (القاهرة)) والشوارع المتقاطعة معه - مديرية الثورة	04/11/2020	أشهر (4)	31,775,191.00	31,760,891.93	99.95%	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠٢٠م	04/09/2021	30,172,847.33	94.96%	1,588,044.60	تم الاستلام الابتدائي	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,000,000.00	18.88%	25,760,891.93	81.07%
26	مشروع صيانة وترميم شارع الميثاق (من تقاطع شارع العال وحتى تقاطع شارع الدائري (القاهرة)) والشوارع المتقاطعة معه - مديرية الثورة	04/11/2020	أشهر (4)	95,138,525.00	91,796,284.52	96.49%	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠٢٠م	08/05/2021	87,206,470.29	91.66%	4,589,814.23	تم الاستلام الابتدائي	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15,000,000.00	15.77%	76,796,284.52	80.72%
27	مشروع صيانة وترميم شارع الحرية (من شارع الدائري الجامعة وحتى تقاطعه مع شارع تونس) والشوارع المتقاطعة معه - مديرية الثورة	04/11/2020	أشهر (4)	71,332,598.50	65,034,397.27	91.17%	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠٢٠م	21/08/2021	61,782,677.41	86.61%	3,251,719.86	تم الاستلام الابتدائي	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12,000,000.00	16.82%	53,034,397.27	74.35%
28	مشروع ترميم بعض الشوارع الرئيسية (شارع قصر عمدان+شارع سوق الرماح+شارع مديرية آزال+شارع سوق نغم) - مديرية آزال المنقول للرصف بالبتل الأخضر	05/09/2020	أشهر (4)	56,154,570.00	62,773,577.48	111.79%	السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠١٩م	01/11/2021	59,634,898.60	106.20%	3,138,678.87	تم الاستلام الابتدائي	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	62,773,577.48	111.79%



التاريخ: Date :

مسلسل	اسم المشروع وموقعه	29	مشروع تنفيذ جسر سطحي لضفاف نفق جولة تعز (الجهة الشرقية باتجاه شارع ٤٥) مديرية الصافية	09/12/2020	اربعة اشهر	38,996,492.16	39,833,059.46	102.15%	نسبة الاجاز التراكمي حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ قيمة الاعمال المنفذة التراكمية	تاريخ الاستلام الابتدائي اجمالي قيمة المسحوصات المصرفية ماليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ نسبة المصروف ماليا من المشروع تراكمي قيمة الضمانات المحتجزة ملاحظات قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨م نسبة الاجاز لسنة ٢٠١٨م قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩م نسبة الاجاز لسنة ٢٠١٩م قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠م نسبة الاجاز لسنة ٢٠٢٠م قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١م نسبة الاجاز لسنة ٢٠٢١م											
30	مشروع تنفيذ جسر سطحي لضفاف نفق جولة شيراتون (الجهة الشرقية باتجاه مسيك) مديرية ازال	09/12/2020	اربعة اشهر	54,030,916.00	50,766,662.22	93.96%	30/10/2021	48,228,329.11	89.26%	2,538,333.11	تم الاستلام الابتدائي	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	50,766,662.22	93.96%
31	مشروع تنفيذ قناة تصريف مياه الامطار حارة السد - مديرية ازال	13/01/2021	اربعة اشهر	54,003,682.80	0.00	0.00%	تم الغاء المشروع واسترجاع الدفعة المقدمة من قناة الغصين تقطع شارع السلال	0.00%	0.00%	0.00%	تم الغاء المشروع	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
32	مشروع تنفيذ قناة تصريف مياه الامطار شارع الاربعةين شعب الحافة - مديرية شعوب	09/12/2020	شهرين	20,012,364.40	19,930,754.33	99.59%	18/04/2021	18,934,216.61	94.61%	996,537.72	تم الاستلام الابتدائي	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	19,930,754.33	99.59%



Date : التاريخ:

33	اسم المشروع وموقعه	33	مشروع تنفيذ معالجة اضرار السيول الخط الرئيسي بني جرموز (حارة خبر) مديرية بني الحارث	09/12/2020	سنة الشهر	59,993,998.00	قيمة الاعمال المنفذة التراكمية حتى 31/12/2021م	52,434,114.39	نسبة الاجاز التراكمي	87.40%	جهة التمويل	تاريخ الاستلام الابتدائي	اجمالي قيمة المستخلصات المصروفة ماليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى 31/12/2021م	نسبة المصروف ماليا من المشروع تراكمي	73.71%	قيمة الضمانات المحتجزة	ملاحظات	قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2018م	نسبة الاجاز لسنة 2018م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2019م	نسبة الاجاز لسنة 2019م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2020م	نسبة الاجاز لسنة 2020م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2021م	نسبة الاجاز لسنة 2021م
34		34	تنفيذ اعمال صيانة وتأهيل الجزر الوسطية والامكان العامة والتحصينات المرورية والمجمعات والتأفورات بامانة العاصمة	09/12/2020	سنة الشهر	90,014,110.20	قيمة الاعمال المنفذة التراكمية حتى 31/12/2021م	88,642,742.35	نسبة الاجاز التراكمي	98.48%	جهة التمويل	تاريخ الاستلام الابتدائي	اجمالي قيمة المستخلصات المصروفة ماليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى 31/12/2021م	نسبة المصروف ماليا من المشروع تراكمي	93.55%	قيمة الضمانات المحتجزة	ملاحظات	قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2018م	نسبة الاجاز لسنة 2018م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2019م	نسبة الاجاز لسنة 2019م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2020م	نسبة الاجاز لسنة 2020م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2021م	نسبة الاجاز لسنة 2021م
35		35	مشروع تنفيذ طبقة اسفلتية ناعمة لعدد اربعة انفاق (نفق الرئاسة المصباحي - نفق الرئاسة شارع الاربين - نفق جولة الساعة - نفق جولة عصر)	15/02/2021	اربعة اشهر	150,013,979.20	قيمة الاعمال المنفذة التراكمية حتى 31/12/2021م	147,386,794.41	نسبة الاجاز التراكمي	98.25%	جهة التمويل	تاريخ الاستلام الابتدائي	اجمالي قيمة المستخلصات المصروفة ماليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى 31/12/2021م	نسبة المصروف ماليا من المشروع تراكمي	93.34%	قيمة الضمانات المحتجزة	ملاحظات	قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2018م	نسبة الاجاز لسنة 2018م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2019م	نسبة الاجاز لسنة 2019م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2020م	نسبة الاجاز لسنة 2020م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2021م	نسبة الاجاز لسنة 2021م
36		36	اعمال الطوارئ 2 (مشروع تعبئة الحفائر الاسفلتية بين اعمال الرصف الجبري والاسفلت واعمال الجسور السطحية والاسفلت وتعبئة الحفائر الاسفلتية الصغيرة للشوارع الرئيسية - المجموعة الاولى)	07/02/2021	ثلاثة اشهر	69,997,770.00	قيمة الاعمال المنفذة التراكمية حتى 31/12/2021م	67,959,000.00	نسبة الاجاز التراكمي	97.09%	جهة التمويل	تاريخ الاستلام الابتدائي	اجمالي قيمة المستخلصات المصروفة ماليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى 31/12/2021م	نسبة المصروف ماليا من المشروع تراكمي	97.09%	قيمة الضمانات المحتجزة	ملاحظات	قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2018م	نسبة الاجاز لسنة 2018م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2019م	نسبة الاجاز لسنة 2019م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2020م	نسبة الاجاز لسنة 2020م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2021م	نسبة الاجاز لسنة 2021م



Date : التاريخ:

مسلسل	اسم المشروع وموقعه	37	مشروع ترميم وتعبئة الحفريات بالاسفلت (الساخن والبارد) والبسكورس لعدد من الشوارع الرئيسية بالامانة	21/04/2021	خمس اشهر	100,000,260.00	92,396,235.00	نسبة الانجاز التراكمي حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	نسبة التمويل	تاريخ الاستلام الابتدائي	اجمالي قيمة المستخلصات المصروفة ماليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	نسبة المصروف ماليا من المشروع تراكمي	قيمة الضمانات المحتجزة	ملاحظات	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٨م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٩م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢٠م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢١م
37	مشروع ترميم وتعبئة الحفريات بالاسفلت (الساخن والبارد) والبسكورس لعدد من الشوارع الرئيسية بالامانة	38	مشروع شق الشوارع الرئيسية بوحدة جوار (A+543B0٤٣) بطول ٩٨٠م ومتوسط عرض (٣٦) م بمنطقة السنية - ماعين	03/01/2021	اربعة اشهر	78,384,000.00	78,000,000.00	نسبة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠٢١م	الطوارئ من موازنة ٢٠٢١م	تاريخ الاستلام الابتدائي	اجمالي قيمة المستخلصات المصروفة ماليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	نسبة المصروف ماليا من المشروع تراكمي	قيمة الضمانات المحتجزة	ملاحظات	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٨م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٩م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢٠م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢١م
38	مشروع شق الشوارع الرئيسية بوحدة جوار (A+543B0٤٣) بطول ٩٨٠م ومتوسط عرض (٣٦) م بمنطقة السنية - ماعين	39	مشروع تنفيذ جسر سطحي لاضفاف جسر الحشيشية الجهة الغربية - مديرية شعوب - وحدة جوار (٨٣٢+٨٤٣)	30/06/2021	اربعة اشهر	116,987,479.72	115,453,602.91	نسبة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠٢١م	الطوارئ من موازنة ٢٠٢١م	تاريخ الاستلام الابتدائي	اجمالي قيمة المستخلصات المصروفة ماليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	نسبة المصروف ماليا من المشروع تراكمي	قيمة الضمانات المحتجزة	ملاحظات	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٨م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٩م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢٠م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢١م
39	مشروع تنفيذ جسر سطحي لاضفاف جسر الحشيشية الجهة الغربية - مديرية شعوب - وحدة جوار (٨٣٢+٨٤٣)	40	مشروع تعبئة وترميم الحفريات التي تنشأ خلال وبعد موسم الامطار بالاسفلت الساخن والبسكورس (المرحلة الثانية) (٢٠٢١)	10/10/2021	٦ اشهر	81,918,810.00	60,082,371.83	نسبة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠٢١م	الطوارئ من موازنة ٢٠٢١م	تاريخ الاستلام الابتدائي	اجمالي قيمة المستخلصات المصروفة ماليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	نسبة المصروف ماليا من المشروع تراكمي	قيمة الضمانات المحتجزة	ملاحظات	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٨م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٩م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢٠م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢١م
40	مشروع تعبئة وترميم الحفريات التي تنشأ خلال وبعد موسم الامطار بالاسفلت الساخن والبسكورس (المرحلة الثانية) (٢٠٢١)																					



Date : التاريخ:

مسلسل	41	42	43	44
اسم المشروع وموقعه	مشروع اعادة التأهيل والتوسعة لفتحات المياه في سور الجامعة والمجرى المائي +تنظيف مصائد مياه الامطر في عدد من شوارع الامانة + عدد من الاعمال الاخرى	مشروع قناة تصريف مياه الامطار لتقاطع شارع الخمينين مع شارع السلال - مديرية بني الحارث	مشروع تاهيل ساحة مبنى جهز الامن والمخابرات	مشروع الجسر السطحي لشارع الثلاثين المقاطع مع سائلة الفيضبة (مديرية / شعوب)
تاريخ العقد	21/08/2021	02/10/2021	20/11/2021	20/11/2021
مدة العقد	3 شهور	4 شهور	2 شهور	4 شهور
قيمة العقد	14,298,020.00	65,820,932.00	28,542,200.00	74,203,020.00
قيمة الاعمال المنفذة التراكمية حتى 31/12/2021م	11,226,695.00	33,951,099.70	23,359,045.40	30,891,579.96
نسبة الانجاز التراكمي	78.52%	51.58%	81.84%	41.63%
جهة التمويل	الطوارئ من موازنة 2021م	الطوارئ من موازنة 2021م	الطوارئ من موازنة 2021م	الطوارئ من موازنة 2021م
تاريخ الاستلام الابتدائي				
اجمالي قيمة المستخلصات المصروفة ماليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى 31/12/2021م	9,652,448.00	36,929,956.19	5,708,440.00	14,840,604.00
نسبة المصروف ماليا من المشروع تراكمي	67.51%	56.11%	20.00%	20.00%
قيمة الضمانات المحتجزة	1,122,669.52	3,395,109.97	2,335,904.54	0.00
ملاحظات	جاري الاستلام الابتدائي	العمل مستمر	جاري الاستلام الابتدائي	العمل مستمر
قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2018م	0.00	0.00	0.00	0.00
نسبة الانجاز لسنة 2018م	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2019م	0.00	0.00	0.00	0.00
نسبة الانجاز لسنة 2019م	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2020م	0.00	0.00	0.00	0.00
نسبة الانجاز لسنة 2020م	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
قيمة الاعمال المنفذة لسنة 2021م	11,226,695.00	33,951,099.70	23,359,045.40	30,891,579.96
نسبة الانجاز لسنة 2021م	78.52%	51.58%	81.84%	41.63%



Date : التاريخ:

مسلسل	اسم المشروع وموقعه	45	مشروع الجسر السطحي قبل نقطة الازرقين + ترميم وصيانة الطبقة الاسفلتية المتضرره امام سوق جدر - (مديرية / بني الحارث)	20/11/2021	شهور ٥	273,281,217.00	25,000,000.00	9.15%	الطوارئ من موازنة ٢٠٢١ م	تاريخ الاستلام الابتدائي	اجمالي قيمة المستخلصات المعصوفة ماليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١ م	نسبة المصروف ماليا من المشروع تراكمي	قيمة الضمانات المحتجزة	ملاحظات	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨ م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٨ م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩ م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٩ م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠ م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢٠ م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١ م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢١ م
		46	مشروع اعاده بناء السور الفاصل بين نادي الوحدة ومدرسة جمال عبدالناصر - (مديرية / التحرير)	20/11/2021	شهور ٤	6,075,750.00	4,757,750.00	78.31%	الطوارئ من موازنة ٢٠٢١ م		54,656,243.40	20.00%	475,775.00	العمل مستمر	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	25,000,000.00	9.15%
		47	مشروع المحافظة على المعالم الاثريه والتاريخية لمدينة صنعاء القديمة - (ترميم واعادة تاهيل باب اليمن شاملا الساحات الداخلية والخارجية + اعادة بناء باب شعوب التاريخي)				0.00		السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠٢١ م				475,775.00	جاري توقيع العقود	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	4,757,750.00	78.31%
		48	مشروع توريد وتركيب عدد ١٦ كشافة اثاره تعمل بالطاقة الشمسية بشارع الستين				0.00		السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠٢١ م					جاري توقيع العقود	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%



Date : التاريخ:

مسلسل	اسم المشروع وموقعه	49	مشروع إعادة التأهيل والترميم والصيانة لشارع المقالح - حي الاصبحي - مديرية السبعين	50	مشروع صيانة وترميم شارع القناة التعليمية وحدة جوار (٧٢٣) الجراف الغربي - مديرية الثورة	51	مشروع ترميم عدد من الشوارع في حي هبرة وحدة جوار ٩١١ - مديرية شعوب
تاريخ العقد	تاريخ العقد	49	أشهر	50	أشهر	51	أشهر
مدة العقد	مدة العقد	49	أشهر	50	أشهر	51	أشهر
قيمة العقد	قيمة العقد	49	45,710,614.13	50	27,897,637.50	51	45,710,614.13
قيمة الاعمال المنفذة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	قيمة الاعمال المنفذة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	49	0.00	50	0.00	51	0.00
نسبة الاجاز التراكمي	نسبة الاجاز التراكمي	49	نسبة ٧٥% من العقد من المبادرات المجتمعية من موازنة ٢٠٢١م	50	نسبة ٧٥% من العقد من المبادرات المجتمعية من موازنة ٢٠٢١م	51	نسبة ٧٥% من العقد من المبادرات المجتمعية من موازنة ٢٠٢١م
جهة التمويل	جهة التمويل	49		50		51	
تاريخ الاستلام الابتدائي	تاريخ الاستلام الابتدائي	49		50		51	
اجمالي قيمة المستخلصات المصروفة ماليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	اجمالي قيمة المستخلصات المصروفة ماليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	49		50		51	
نسبة المصروف ماليا من المشروع تراكمي	نسبة المصروف ماليا من المشروع تراكمي	49		50		51	
قيمة الضمانات المحتجزة	قيمة الضمانات المحتجزة	49		50		51	
ملاحظات	ملاحظات	49	جاري توقيع العقود	50	جاري توقيع العقود	51	جاري توقيع العقود
قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨م	49	0.00	50	0.00	51	0.00
نسبة الاجاز لسنة ٢٠١٨م	نسبة الاجاز لسنة ٢٠١٨م	49	0.00%	50	0.00%	51	0.00%
قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩م	49	0.00	50	0.00	51	0.00
نسبة الاجاز لسنة ٢٠١٩م	نسبة الاجاز لسنة ٢٠١٩م	49	0.00%	50	0.00%	51	0.00%
قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠م	49	0.00	50	0.00	51	0.00
نسبة الاجاز لسنة ٢٠٢٠م	نسبة الاجاز لسنة ٢٠٢٠م	49	0.00%	50	0.00%	51	0.00%
قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١م	49	0.00	50	0.00	51	0.00
نسبة الاجاز لسنة ٢٠٢١م	نسبة الاجاز لسنة ٢٠٢١م	49	0.00%	50	0.00%	51	0.00%



Date : التاريخ:

مسلسل	اسم المشروع وموقعه	تاريخ العقد	مدة العقد	قيمة العقد	قيمة الاعمال المنفذة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	نسبة الانجاز التراكمي	جهة التمويل	تاريخ الاستلام الابتدائي	اجمالي قيمة المستخلصات المصروفة ماليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	نسبة المصروف ماليا من المشروع تراكمي	قيمة الضمانات المحتجزة	ملاحظات	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٨م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٩م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢٠م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢١م
52	مشروع رصف ججري لشوارع حارة الطراعي غرب فندق تاج سبا وحدة جوار (٥١١) - مديرية التحرير				0.00		نسبة ٧٥% من العقد من المبادرات المجتمعية من موازنة ٢٠٢١م					جاري توقيع العقود	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
53	مشروع تنفيذ استراحات ومساح بالمنطقة الشمالية لحديقة الثورة (مشروع الاستثمار)				0.00		السلطة المحلية من نسبة الـ ٤٥% من موازنة ٢٠٢١م					جاري توقيع العقود	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
54	مشروع تنفيذ مجسم القداني الشهيد (بوقاضل طومر) في جولة تقاطع شارع الستين الشمالي مع شارع عمران				0.00		صندوق النظافة والتحصين					جاري توقيع العقود	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
55	مشروع البجيرة الاصطناعية (حوض حصاد مياه الامطار) دار الحيد - جوار معسكر الحفا			0.00	15,000,000.00		من الوحدة التنفيذية حتى يتم تمويلية مستقبلا					العمل مستمر	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15,000,000.00	0.00%





التاريخ: Date :

مسلسل	اسم المشروع وموقعه	تاريخ العقد	مدة العقد	قيمة العقد	قيمة الاعمال المنفذة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	نسبة الانجاز التراكمي	جهة التمويل	تاريخ الاستلام الانتدائي	اجمالي قيمة المستخلصات المصروفة ماليا شاملا الدفعة المقدمة التراكمية حتى ٣١/١٢/٢٠٢١م	نسبة المصروف ماليا من المشروع تراكمي	قيمة الضمانات المحتجزة	ملاحظات	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٨م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٨م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠١٩م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠١٩م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢٠م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢٠م	قيمة الاعمال المنفذة لسنة ٢٠٢١م	نسبة الانجاز لسنة ٢٠٢١م
56	مشروع تصفية موقع قرائش عذبان (مقر الوحدة حاليا) من المخلفات و عمل تجهيزات للحركة والمعدات ومحطة المحروقات وينشر				20,000,000.00		من الوحدة التنفيذية					العمل مستمر	0.00		0.00	#DIV/0!	0.00		20,000,000.00	0.00%
57	مشروع الأتمته			18,552,734.00	18,552,734.00	100.00%	من الوحدة التنفيذية		18,552,734.00	100.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	18,552,734.00	100.00%
	الاجمالي			3,775,472,295.33	2,779,768,827.70	73.89%			2,492,319,802.66	66.01%	159,579,496.82		158,341,056.00		98,935,200.00		924,046,258.39		1,598,446,313.31	





Date : التاريخ:


٤-٢-٣ مخططات بيانية توضح المشاريع المنفذة من قبل الوحدة وقيمة العقود الموقعة وقيمة الاعمال المنفذة لهذه المشاريع :-



Date : التاريخ:

مخطط يوضح قيمة المشاريع التي تنفذها الوحدة التنفيذية

■ قيمة العقد للمشروع ■ قيمة الاعمال المنفذة التراكمية للمشروع

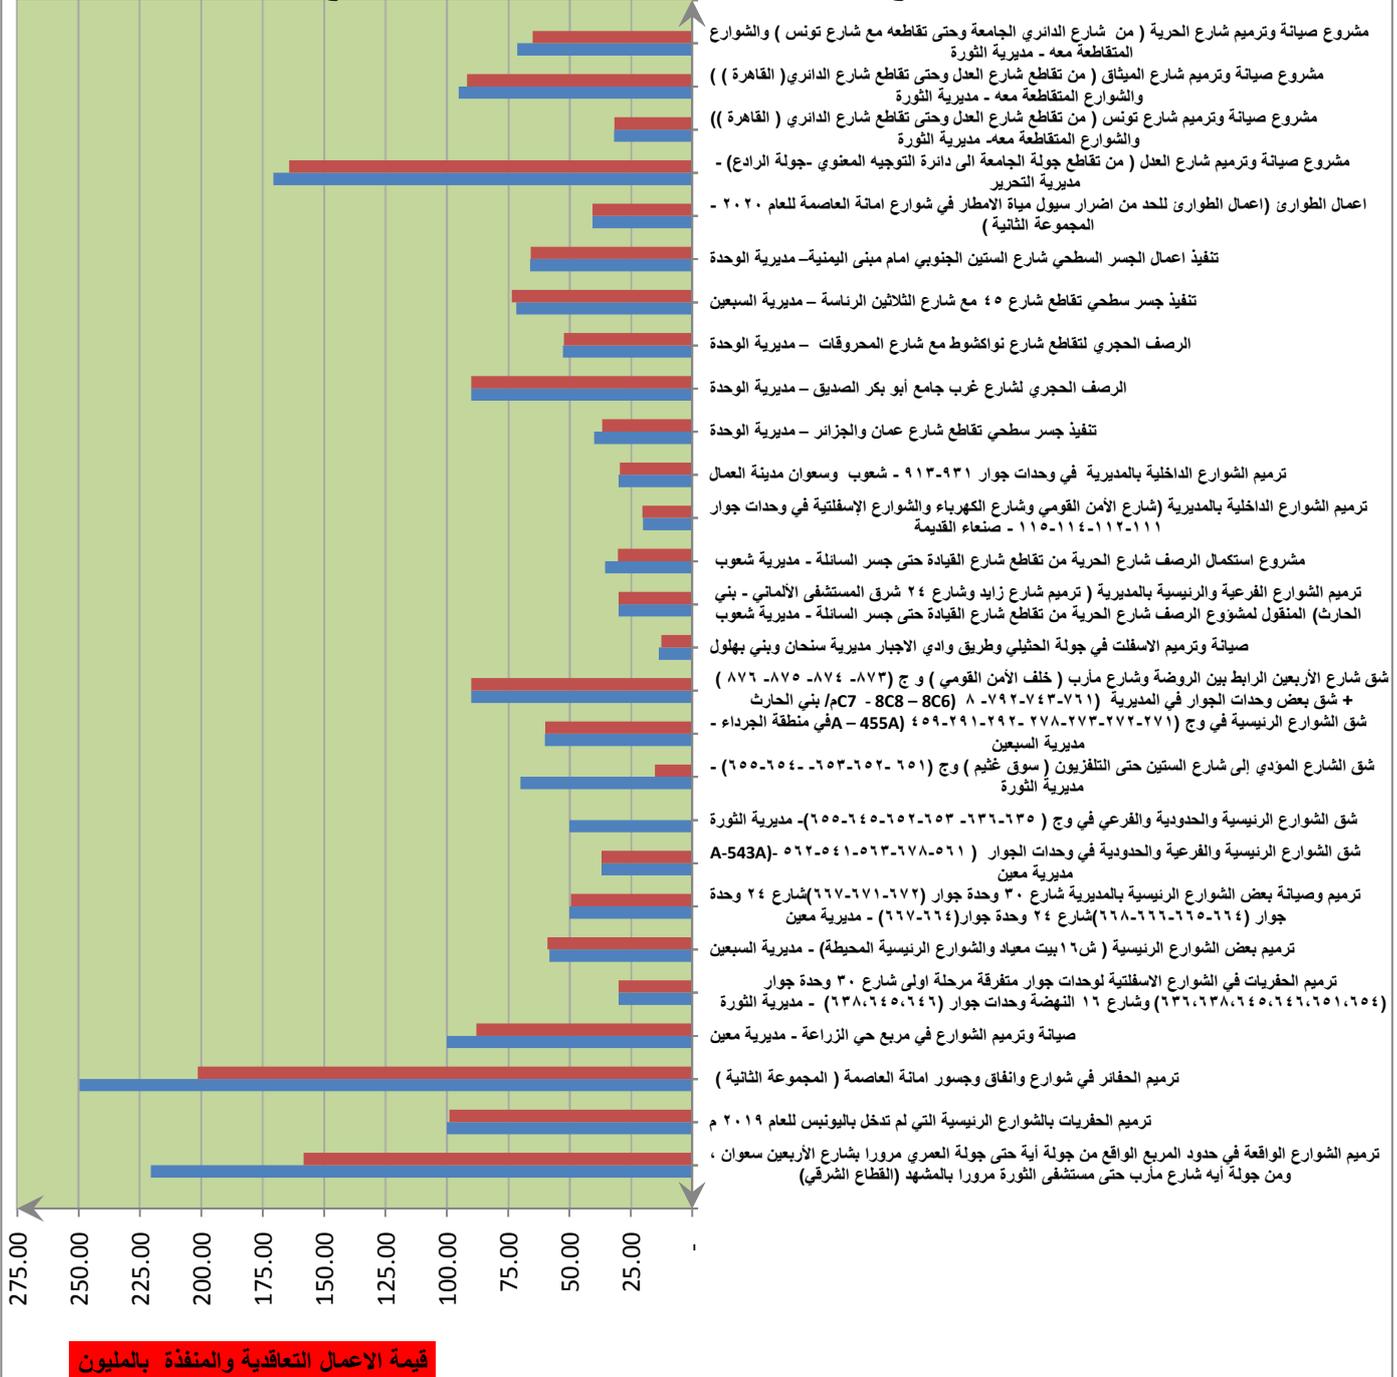


قيمة الاعمال التعاقدية والمنفذة بالمليون



Date : التاريخ:

مخطط يوضح قيمة المشاريع التي تنفذها الوحدة التنفيذية

■ قيمة العقد للمشروع ■ قيمة الاعمال المنفذة التراكمية للمشروع

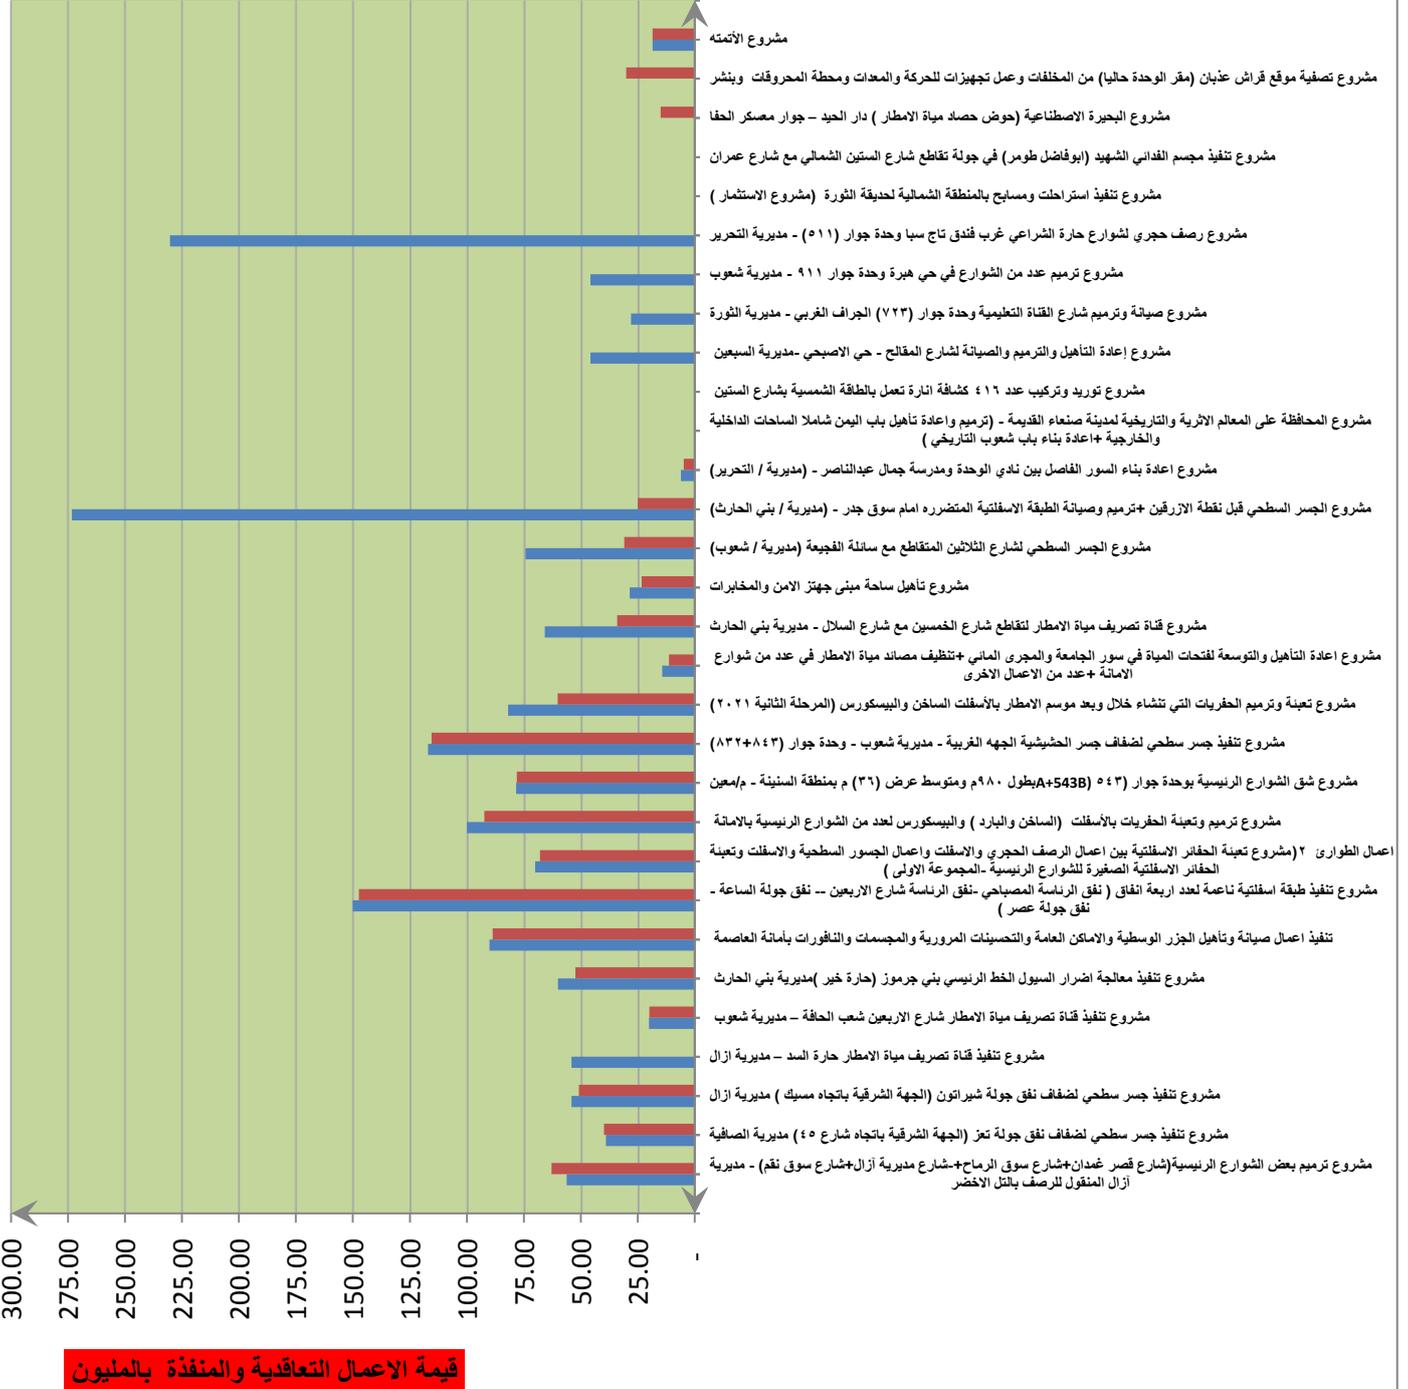

قيمة الاعمال التعاقدية والمنفذة بالمليون





Date : التاريخ:

خامسا: التراخيص المتعلقة بأعمال الحفريات الخاصة بخدمات المواطنين والجهات الخدمية:

١. منح تراخيص حفر في الطرق الاسفلتية للمواطنين والجهات الخدمية بعدد (٥٣٩) ومساحة (٢٧١٤٦) متر مربع
٢. اعادة ترميم الحفريات المرخصة للمواطنين لعدد (١٤٥) ومساحة (٣,٢٦١) متر مربع.
٣. اعادة ترميم الحفريات المرخصة للجهات الخدمية لعدد (١٣٨) ومساحة (٨,٤٧٤) متر مربع.
٤. احالة عدد من المخالفين للنياية العامة والقضاء.



Date : التاريخ:

سادسا: المعوقات والمشاكل :

١. عدم وجود مبنى او مقر خاص بالوحدة وانما ٣ غرف بالدور الرابع بمكتب الاشغال .
٢. ضعف اسطول معدات الوحدة التنفيذية وعدم كفايته لمواجهة الاعمال المطلوبة من الوحدة التنفيذية بالإضافة الى قدمها وكثرة الاعطال وارتفاع كلفة الصيانة لها.
٣. عدم الاستجابة السريعة للأجهزة الضبطية في المديريات للحد من الحفريات العشوائية وغير المرخصة.
٤. تدني المخصصات المالية المعتمدة للوحدة التنفيذية في اطار الموازنة العامة لمواجهة تكاليف اعمال الصيانة والترميمات الطارئة وصيانة الجسور والانفاق والمباني العامة.
٥. عدم حصول الوحدة التنفيذية على اي مساعدات او هبات او تبرعات منذ انشائها.
٦. عدم تصفية المشروع (ترميم الشوارع الواقعة في حدود المربع الواقع من جولة أية حتى جولة العمري مرورا بشوارع الأربعين سعوان ، ومن جولة أيه شارع مأرب حتى مستشفى الثورة مرورا بالمشهد (القطاع الشرقي) الموقع مع صندوق الصيانة والذي تم الغاء العقد من طرف واحد من الصندوق من دون صرف المستحقات المتبقية واطلاق الضمانات المحجوزة وبإجمالي مبلغ اربعون مليون ريال .
٧. عدم صرف مستحقات الوحدة التنفيذية واستلام المشروع واطلاق الضمانات المحجوزة في مشروع ترميم الحفريات بالشوارع الرئيسية التي لم تدخل باليونس للعام ٢٠١٩ م وبإجمالي مبلغ عشرون مليون ريال .
٨. تأخير صرف مستحقات الوحدة التنفيذية لدى صندوق صيانة الطرق بمشروع ترميم الحفائر في شوارع وانفاق وجسور امانة العاصمة (المجموعة الثانية) وبإجمالي مبلغ ستة وخمسون مليون ريال .
٩. عدم تنسيق الاجهزة المحلية والمركزية ذات العلاقة مع الوحدة التنفيذية لإيجاد قاعدة بيانات تحدد مسارات البنى التحتية في جميع مناطق ومديريات العاصمة واسقاطها على خارطة رقمية تمكن من الرجوع اليها عند تنفيذ المشاريع وتسهيل عمليات ازاحتها وتفادي اتلافها.
١٠. عدم الغاء الادارات المتعارضة مع الوحدة التنفيذية في المهام والاختصاصات بأمانة العاصمة.
١١. عدم تمكين الوحدة التنفيذية من الاليات والمعدات بحسب قرار الانشاء للوحدة التنفيذية الصادر من رئيس المجلس السياسي الاعلى رقم (٦٣) لسنة ٢٠٢١م.



Date : التاريخ:

١٢. تعارض بعض المزارع والمباني الخاصة بالمواطنين مع مسار مشاريع الشق و توقيف المواطنين للعمل و عدم توفير المبالغ الكافية لتعويض المواطنين عن المزارع والمباني المتعارضة مع المسار في مشاريع الشق.
١٣. عدم توفر اراضي ومساحات لتثوين وغرلة مواد الاساس والردميات .
١٤. عدم توفر مقالع لإنتاج مواد البيسكورس وذلك من الجبال المحيطة بأمانة العاصمة .
١٥. تأخر اجراءات الاستلام الابتدائي والنهائي للأعمال المنفذة من قبل الوحدة واطلاق الضمانات المحجوزة مما يؤثر سلبا على السيولة لتنفيذ مشاريع اخرى.
١٦. حجز رصيد تراخيص المواطنين كرصيد دفترى وعدم السماح بالصرف منه مع انها مبالغ تم توريدها لإعادة الاسفلت للحفريات المرخصة .



Date : التاريخ:

سابعا: التوصيات:

١. تخصيص الدور الرابع لمكتب الاشغال للوحدة التنفيذية او استئجار مقر للوحدة التنفيذية لكي يستوعب جميع الادارات .
٢. توفير مخصصات مالية لشراء المعدات المطلوبة لعمل الوحدة التنفيذية والتي تم الرفع بها الى قيادة الامانة.
٣. الزام الاجهزة الضبطية بالاستجابة السريعة مع الوحدة التنفيذية للحد من الحفريات العشوائية والغير مرخصة.
٤. اعتماد مخصصات مالية للوحدة التنفيذية في اطار الموازنة العامة لمواجهة تكاليف اعمال الصيانة والترميمات الطارئة
٥. توجيه المساعدات والهبات والتبرعات الخاصة بصيانة شبكة الطرق والانفاق والجسور والارصفة والساحات والميادين والمباني الواقعة في الاطار الجغرافي لأمانة العاصمة للتنفيذ عبر الوحدة التنفيذية.
٦. صرف مستحقات الوحدة التنفيذية اولا بأول بحسب الاعمال المنفذة والوثائق المؤيدة للصرف .
٧. تصفية المشروع السابق مع صندوق صيانة الطرق مشروع (ترميم الشوارع الواقعة في حدود المربع الواقع من جولة أية حتى جولة العمري مرورا بشوارع الأربعين سعوان ، ومن جولة أية شارع مأرب حتى مستشفى الثورة مرورا بالمشهد (القطاع الشرقي) وصرف المستحقات المتبقية واطلاق الضمانات المحجوزة.
٨. صرف مستحقات الوحدة التنفيذية واستلام المشروع واطلاق الضمانات المحجوزة في مشروع ترميم الحفريات بالشوارع الرئيسية التي لم تدخل باليونيس للعام ٢٠١٩ م.
٩. صرف مستحقات الوحدة التنفيذية لدى صندوق صيانة الطرق بمشروع ترميم الحفائر في شوارع وانفاق وجسور امانة العاصمة (المجموعة الثانية) .
١٠. مخاطبة الجهات الممولة دوليا بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية في جميع الاعمال ذات العلاقة بعمل الوحدة التنفيذية.
١١. الزام الاجهزة المحلية والمركزية ذات العلاقة بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لإيجاد قاعدة بيانات تحدد مسارات البنى التحتية في جميع مناطق ومديريات العاصمة واسقاطها على خارطة رقمية تمكن من الرجوع اليها عند تنفيذ المشاريع وتسهيل عمليات ازاحتها وتفادي اتلافها.





Date : التاريخ:

١٢. إلغاء الإدارات المتعارضة مع الوحدة التنفيذية في المهام والاختصاصات بأمانة.
١٣. توفير أربعة مواقع موزعة على الأمانة وتسلم للوحدة التنفيذية لاستخدامها في تشوين وغريلة مواد الأساس والردميات .
١٤. توفير مقالع لإنتاج البيسكورس والردميات وذلك في الجبال المحيطة بأمانة العاصمة بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ..
١٥. وضع آلية واضحة تلزم طرفي العقد في تسريع اجراءات صرف المستخلصات والاستلامات الابتدائية والنهائية للمشاريع المنفذة عبر الوحدة .
١٦. اطلاق الرصيد الدفترى المحجوز الذي لدى البنك المركزي الخاص بالوحدة التنفيذية او اعتماد مبلغ لإعادة التراخيص في موازنة الأمانة لإعادة تلك الحفريات .

